




GRB施工状況



クランプクレーンによる排水矢板吊り上げ



施工完了後

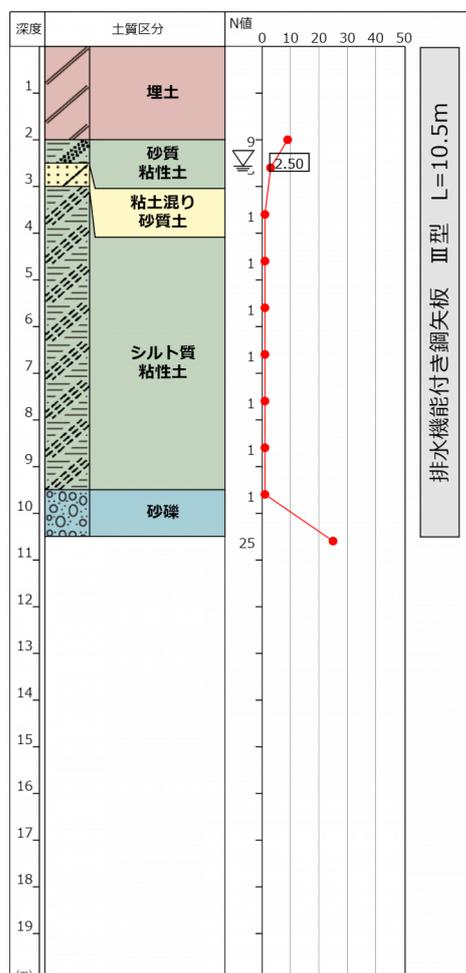

※50を超える場合は換算N値とする。

工 事 名	令和4年度 1号熱田伝馬道路建設工事
工 事 目 的	道路工事
施 工 場 所	愛知県名古屋市長瑞穂区内浜町～浮島町地内
発 注 者	国土交通省 中部地方整備局
元 請 業 者	徳倉建設株式会社
施 工 業 者	株式会社 梶川建設
施 工 期 間	2022年11月～2022年12月
施 工 機 械	サイレントパイラー-F101, クランプクレーンCB1B, パイルランナーPR-1
型 式 ・ 寸 法	排水機能付き鋼矢板 型 L=10.5m
特 長 ・ 効 果	<ul style="list-style-type: none"> 最大N値25付近、砂礫層への排水機能付き鋼矢板を圧入施工（排水部：矢板上端1.0mより下3.5m）。 無振動、無騒音、無削孔施工。 「仮設レス施工」の特徴を生かし、工事用地が狭い現場において近接道路や周辺住民への影響を最小限に抑えて、工事本来の目的を達成することを可能とした。
