




上部障害クリア工法



施工中

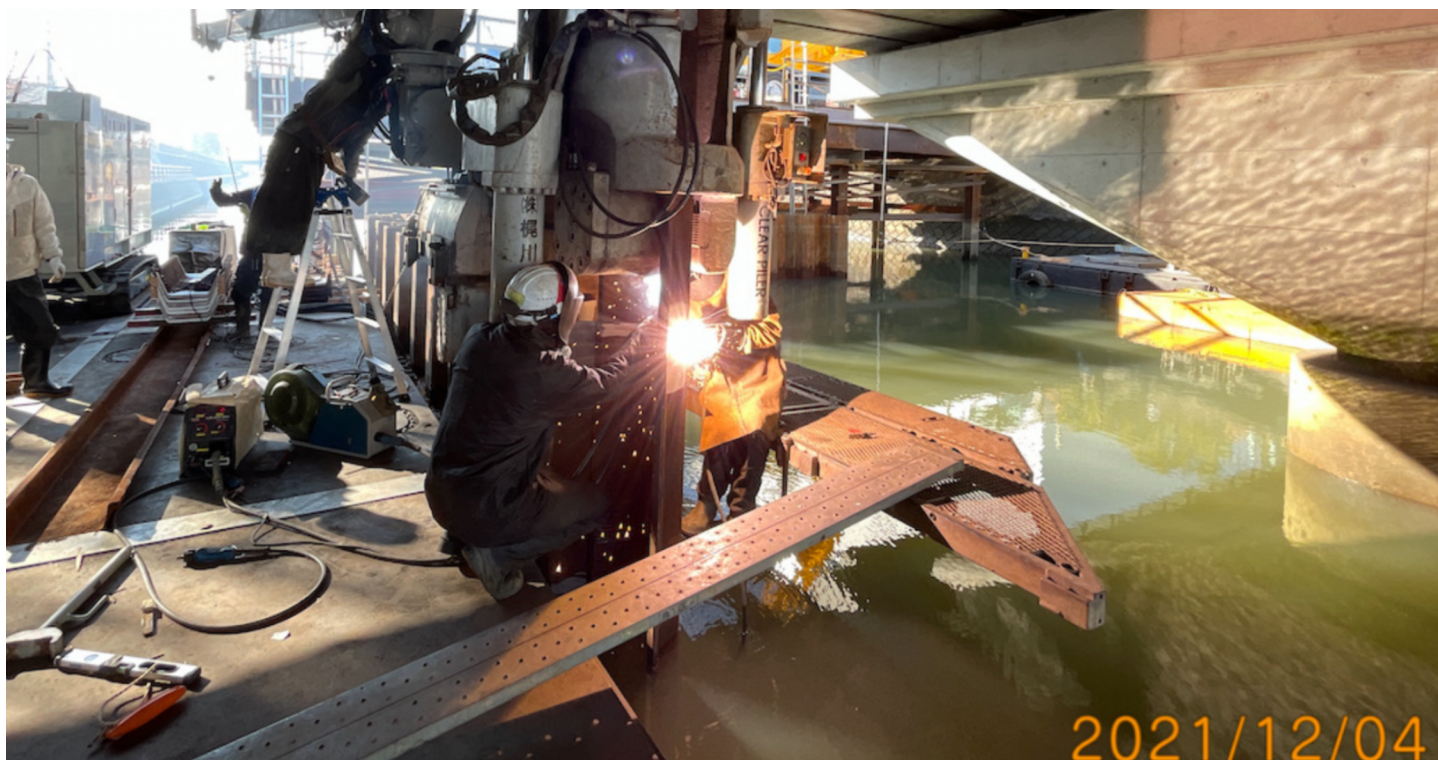


施工前



施工後

工 事 名	令和3年度橋りょう修繕工事（沼口橋耐震補強工）
工 事 目 的	橋梁工事
施 工 場 所	埼玉県 戸田市笹目南町地内外
発 注 者	さいたま県土整備事務所
元 請 業 者	株式会社 ISI・ビルド
施 工 業 者	株式会社 梶川建設
施 工 期 間	2021年12月～2023年3月
施 工 機 械	クリアパイラー CLF120, クリアパイラー CLW100, パイルランナーPR-1
型 式 ・ 寸 法	鋼矢板 VL型 L=14.0m n=144
特 長 ・ 効 果	- 橋脚補強のための仮締切工。上部障害クリア工法による土留鋼矢板圧入 - 鋼矢板天端から桁下までのクリアランスが最小で2.0m - 桁下部はパイルランナーによる鋼矢板運搬

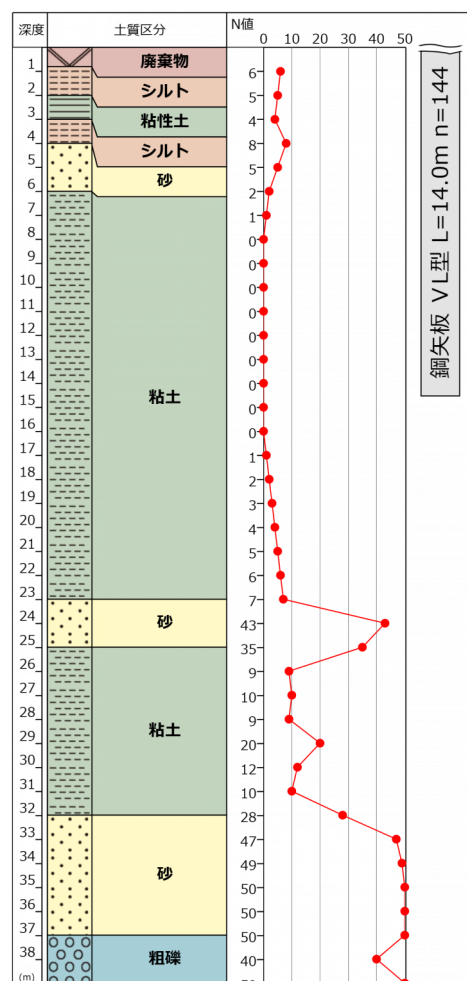

※50を超える場合は換算N値とする。



株式会社 梶川建設

〒447-0033 愛知県碧南市天神町2丁目8番地
TEL :0566-48-3690 FAX :0566-48-7126 URL :http://www.kajikawa.co.jp

Created by GIKEN "PAS-Maker"
