




施工中



施工中



施工中

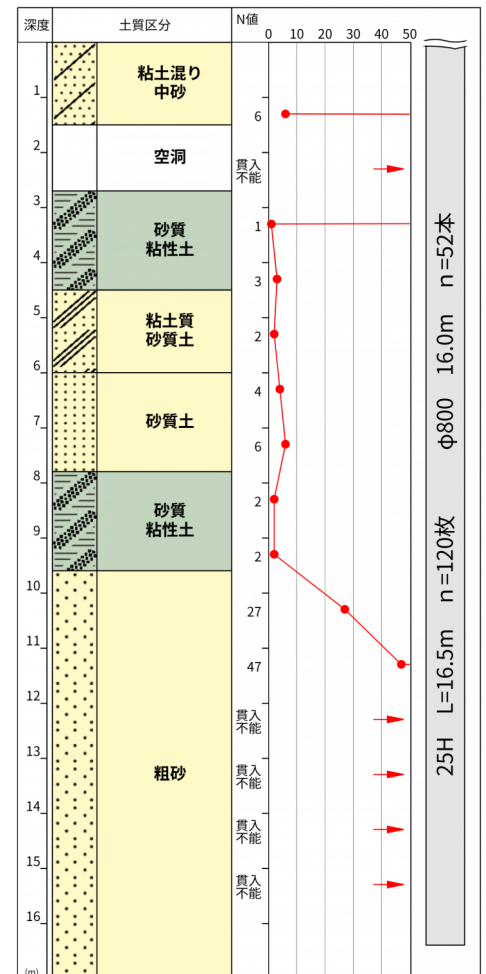

※50を超える場合は換算N値とする。

|           |  |                 |  |
|-----------|--|-----------------|--|
| 工 事 名     | 姫路港網干大江島排水機場仮排水機場土木工事その1   |                 |  |
| 工 事 目 的   | 建築工事   |                 |  |
| 施 工 場 所   | 兵庫県 姫路市網干区   |                 |  |
| 発 注 者     | 兵庫県姫路港管理事務所  |                 |  |
| 元 請 業 者   | 平野組  |                 |  |
| 施 工 業 者   | 株式会社 梶川建設  |                 |  |
| 施 工 期 間   | R7年12月 ~ R8年4月   |                 |  |
| 施 工 機 械   | サイレントパイラー-F302   |                 |  |
| 型 式 ・ 寸 法 | 25H L=16.5m n=120枚   | 800 16.0m n=52本 |  |
| 特 長 ・ 効 果 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ F302を仕様変更を行うことで、1台の圧入機にてハット形鋼矢板と鋼管杭の施工が可能。</li> <li>・ 圧入したハット型鋼矢板を反力として地球と一体化し、鋼管杭を回転圧入した。</li> <li>・ 鋼管杭が切梁代わりになり、切梁要らずの工期短縮、経費節減に繋がった。</li> </ul> |                 |  |
