



ジャイロプレス工法



施工中




施工前



施工後

工 事 名	海老取川防潮堤耐震補強工事（その203）
工 事 目 的	河川工事
施 工 場 所	東京都 大田区羽田五丁目地内から同区羽田空港一丁目地内まで
発 注 者	東京都 建設局 第二建設事務所
元 請 業 者	若築建設 株式会社
施 工 業 者	株式会社 梶川建設
施 工 期 間	2020年2月～2020年4月
施 工 機 械	サイレントパイラーF401, ウォータージェット併用
型 式 ・ 寸 法	φ1200, t=16/14mm, L=20.0m, n=42本
特 長 ・ 効 果	・ 既設護岸の耐震補強工事 ・ 河川幅が狭く、橋と近接する箇所はノンステージング工法にて施工を行った ・ 一部既設支障H形鋼があったが、引抜が出来なかったため、鋼管杭の施工位置を変更して圧入を行った。精度よく施工が出来たため、支障H形鋼に干渉することなく施工が行えた

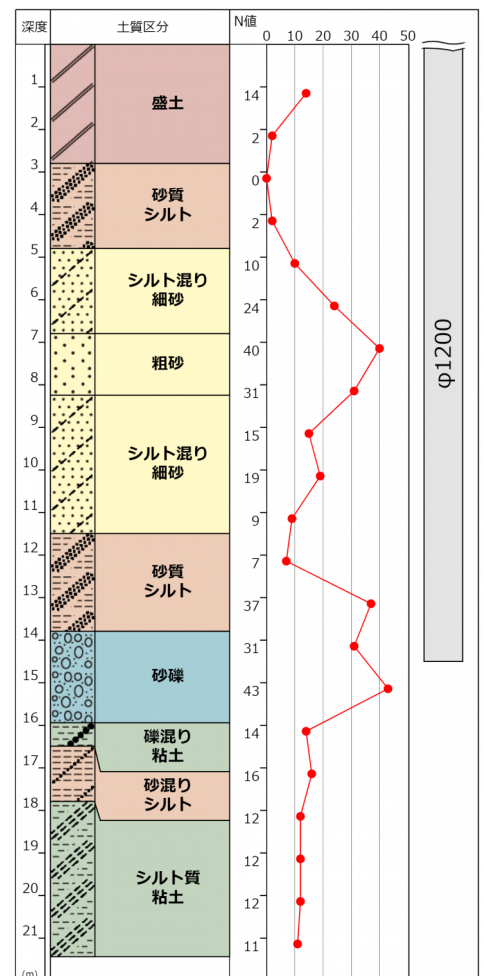

※50を超える場合は換算N値とする。



株式会社 梶川建設

〒447-0033 愛知県碧南市天神町2丁目8番地
TEL : 0566-48-3690 FAX : 0566-48-7126 URL : <http://www.kajikawa.co.jp>

Created by GIKEN "PAS-Maker"
