

ジャイロプレス工法

○ 鋼管杭圧入工法



施工中




施工中



施工前

工 事 名	広域河川堀川改修工事（R4洲崎その3）
工 事 目 的	河川工事
施 工 場 所	愛知県 名古屋市中村区名駅南3丁目始め2カ町
発 注 者	名古屋市緑政土木局
元 請 業 者	名工建設 株式会社
施 工 業 者	株式会社 梶川建設
施 工 期 間	2023年2月 ~ 2023年5月
施 工 機 械	ジャイロパイラーF401
型 式 ・ 寸 法	1200 L=18.5m 、 900 L=16.5m
特 長 ・ 効 果	・GRBシステムにより、施工ヤードが取れなくても、鋼管を運搬し、クランブクレーンで鋼管の建込ができています。

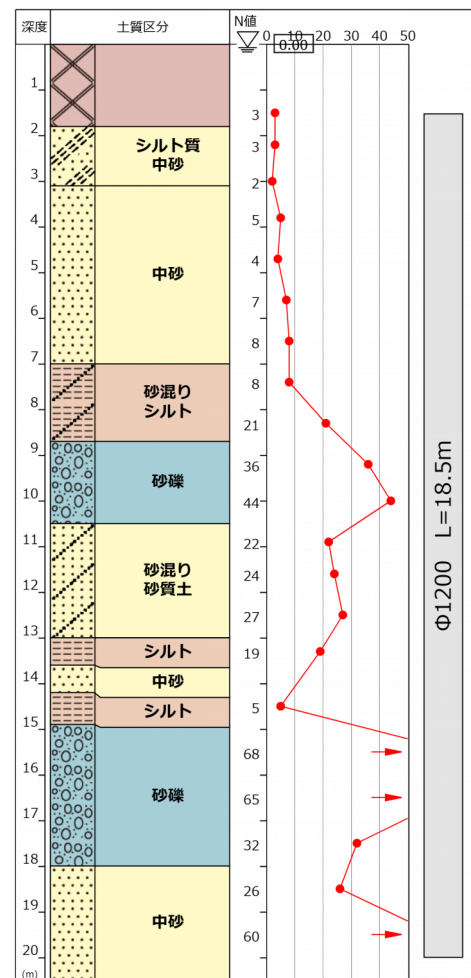

※50を超える場合は換算N値とする。
