



ゼロクリアランス工法



ゼロ矢板圧入工法



ウォータージェット併用工法



施工中




施工前



施工後

工 事 名	広域河川山崎川改修工事（R4菊住）
工 事 目 的	河川工事
施 工 場 所	愛知県 名古屋市南区菊住1丁目地内
発 注 者	名古屋市緑政土木局
元 請 業 者	株式会社 不動テトラ
施 工 業 者	株式会社 梶川建設
施 工 期 間	2022年12月～2023年1月
施 工 機 械	ゼロパイラー JZ100
型 式・寸 法	NS-SP-J 7.0m 230枚
特 長・効 果	・名古屋市を流れる山崎川の護岸改修工事です。 ・近接構造物がある中で、WJ併用圧入が採用されました。 ・近接構造物に影響なく圧入施工完了しました。

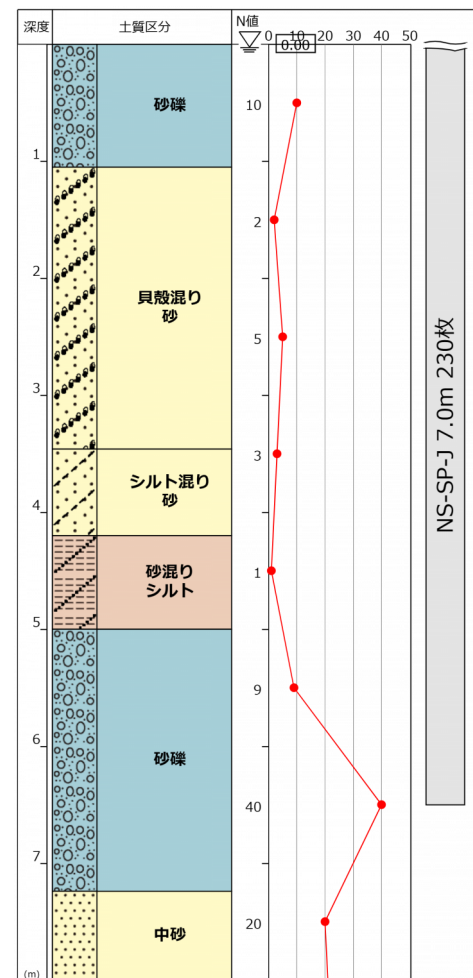

※50を超える場合は換算N値とする。



株式会社 梶川建設

〒447-0033 愛知県碧南市天神町2丁目8番地
TEL :0566-48-3690 FAX :0566-48-7126 URL :http://www.kajikawa.co.jp

Created by GIKEN "PAS-Maker"
