


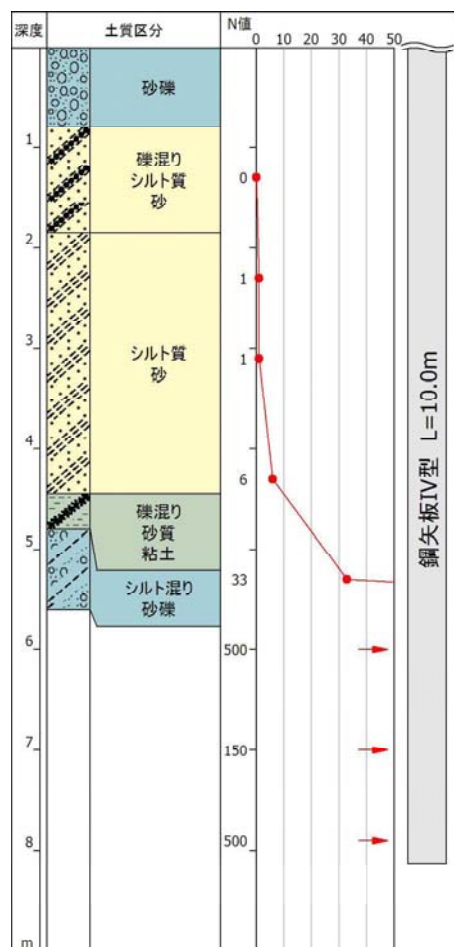

※50を超える場合は換算N値とする。

工 事 名	熊本3号 湯浦川橋下部工(P5)工事
工 事 目 的	橋脚新設の為の仮締切工
施 工 場 所	熊本県 葦北郡芦北町湯浦地先
発 注 者	国土交通省九州地方整備局八代河川国道事務所
施 工 業 者	味岡建設 株式会社
圧 入 業 者	株式会社 新光組
施 工 期 間	H21.10月 ～ H21.11月
施 工 機 械	スーパークラッシュ SCU-400M、SCU-ECO400S
型 式 ・ 寸 法	鋼矢板IV型 L=10.0m n=208枚
特 長 ・ 効 果	① 砂岩(最大N値 500程度)への鋼矢板圧入施工 ② 複数台施工により、工期短縮。 ③ 自走式の機械のため、仮設棧橋の設置面積を削減。 ④ 周辺環境に対して、振動・騒音による悪影響を与えず施工が可能。 ※NETIS(新技術情報提供システム)登録番号:CB-980118-V
