




鋼管杭圧入



継手部材圧入



圧入完了

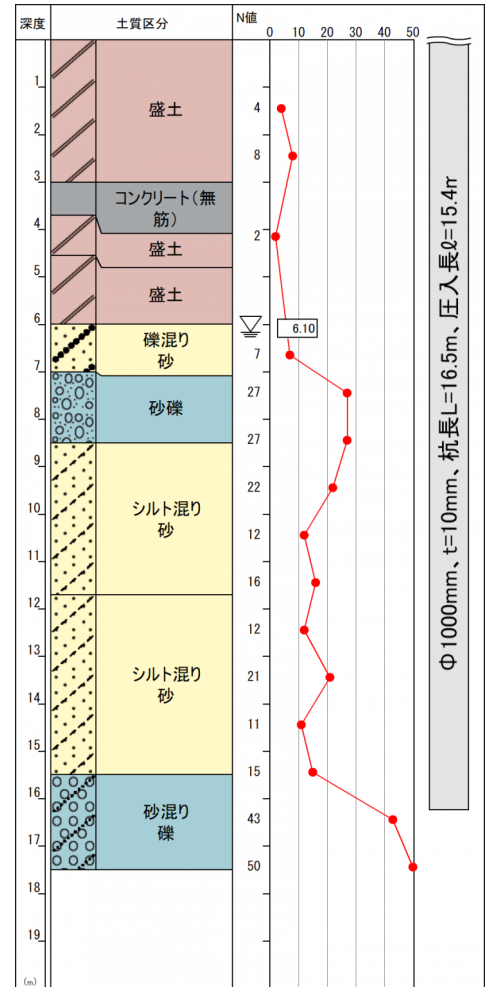

工 事 名	宇佐漁港高潮対策工事 (漁高潮第26-21号&26-24号)
工 事 目 的	海岸工事
施 工 場 所	高知県 土佐市 宇佐町 竜
発 注 者	高知県中央西土木事務所
元 請 業 者	株式会社 龍生
施 工 業 者	株式会社 技研施工
施 工 期 間	2017年10月 ~ 2017年11月
施 工 機 械	ジャイロパイラー F501
型 式 ・ 寸 法	1000mm、t=10mm、杭長L=16.5m、圧入長 =15.4m n=43本
特 長 ・ 効 果	<ul style="list-style-type: none"> 杭は油圧力で把持されて圧入されるため、近接構造物等に接触しないよう自在にコントロールでき、長尺杭でも安全に施工。 先端ビット付きの鋼管杭を回転圧入することによって、障害物をくり抜いて構造物を構築することができる。 圧入機のトルク改善を目的に、ハイスペック機を投入。

※50を超える場合は換算N値とする。
