



上部障害クリア工法




U形鋼矢板圧入工法

ウォータージェット併用工法



1.施工中

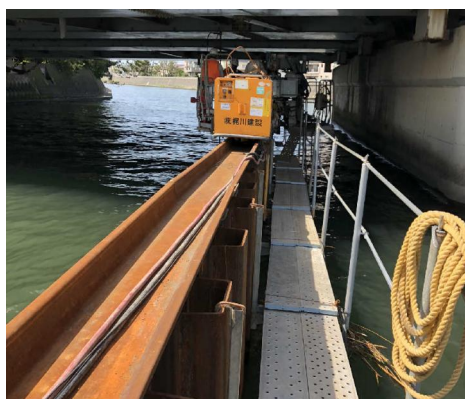


2.施工中（後方側）



3.全体写真（2台施工）

工 事 名	平成29年度 橋りょう補修工事 県単（その1）
工 事 目 的	橋梁工事
施 工 場 所	神奈川県 藤沢市鵜沼海岸二丁目～鵜沼海岸四丁目
発 注 者	神奈川県藤沢土木事務所
元 請 業 者	亀井工業 株式会社
施 工 業 者	株式会社 梶川建設
施 工 期 間	H30年4月～H30年5月
施 工 機 械	クリアパイラー CL70, ジェットリール
型 式 ・ 寸 法	IV型・L=16.5m(10、11箇所継)
特 長 ・ 効 果	・橋梁補修を目的とした仮設土留め。 ・橋梁工事により上部に障害物がある為、空頭制限下で施工できるクリアパイラーを採用。 ・搬入路が狭隘なためコンパクトに資材・機材を搬入できる、周辺住民への騒音、振動対策から、パイラーによる圧入工法が選定された。 ・住民からの苦情、搬入時のトラブルも発生しなかった。

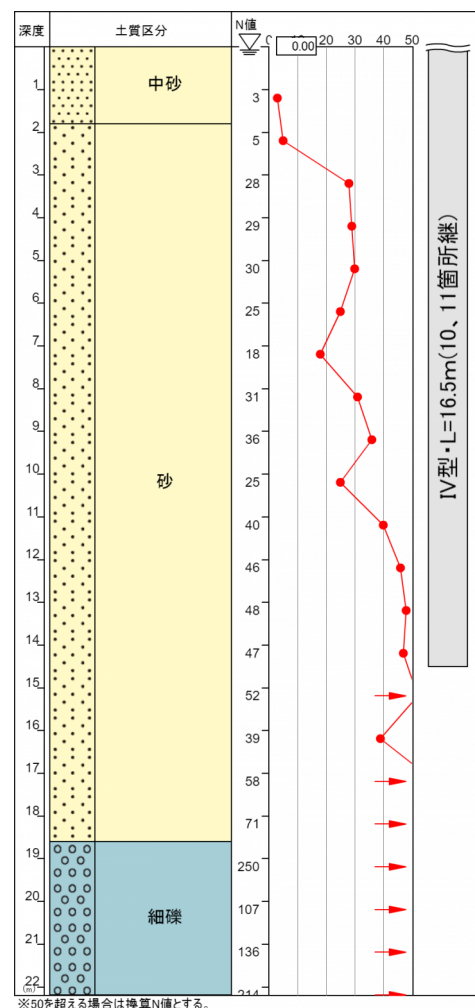

株式会社 梶川建設

〒447-0033 愛知県碧南市天神町2丁目8番地
TEL :0566-48-3690 FAX :0566-48-7126 URL :http://www.kajikawa.co.jp

Created by GIKEN "PAS-Maker"
