



ゼロクリアランス工法



ゼロ矢板圧入工法



硬質地盤クリア工法



施工中




施工前



施工後

工 事 名	令和4年度舞阪漁港水産物供給基盤機能保全工事(玄倉堀物揚場A)
工 事 目 的	港湾工事
施 工 場 所	静岡県 浜松市西区舞阪町
発 注 者	静岡県浜松土木事務所
元 請 業 者	若築建築 (株)
施 工 業 者	株式会社 梶川建設
施 工 期 間	2023年1月 ~ 2023年2月
施 工 機 械	ゼロパイラー SCZ-ECO600S
型 式 ・ 寸 法	NS-SP-J L=8.2m
特 長 ・ 効 果	・ SCZ-ECO600S ・ 既設の鋼矢板が長年潮水に浸かり腐食劣化の為に新たに鋼矢板を圧入することで、港内補強、土留、周辺地盤の液状化対策機能の保持を目的とする。 ・ ゼロクリアランス工法は橋脚構造物と既設矢板の幅のクリアランスが少ない場所でも施工が可能になります。

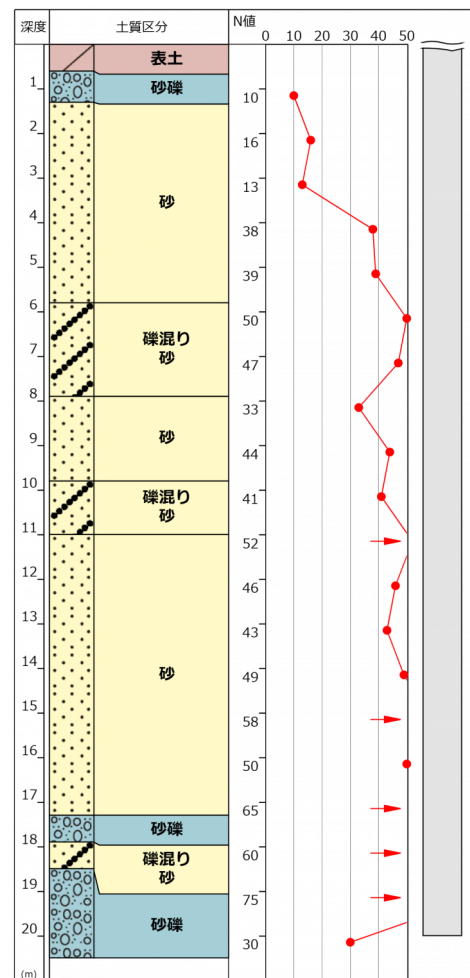

※50を超える場合は換算N値とする。



株式
会社

梶川建設

〒447-0033 愛知県碧南市天神町2丁目8番地

TEL : 0566-48-3690 FAX : 0566-48-7126 URL : <http://www.kajikawa.co.jp>

Created by GIKEN "PAS-Maker"
