



ジャイロプレス工法

○ 鋼管杭圧入工法



施工中


工 事 名	広域河川堀川改修工事(R3松重その3)(週休2日)
工 事 目 的	河川工事
施 工 場 所	愛知県 名古屋市中川区
発 注 者	名古屋市緑生土木局
元 請 業 者	(株)本陣
施 工 業 者	株式会社 梶川建設
施 工 期 間	2022年11月 ~ 2023年11月
施 工 機 械	ジャイロクリアパイラー GRAL1520(SP8)
型 式 ・ 寸 法	φ1400 t=20/14 L=23.5m(1箇所継) N=4本
特 長 ・ 効 果	- 堀川の老朽した護岸を新しくする工事としてジャイロプレス工法を採用 - 既設杭と杭天端が違う為、既設杭の両端に反力矢板を打設しての施工 - 街の景観を壊すことなく施工することが可能



施工前



施工後

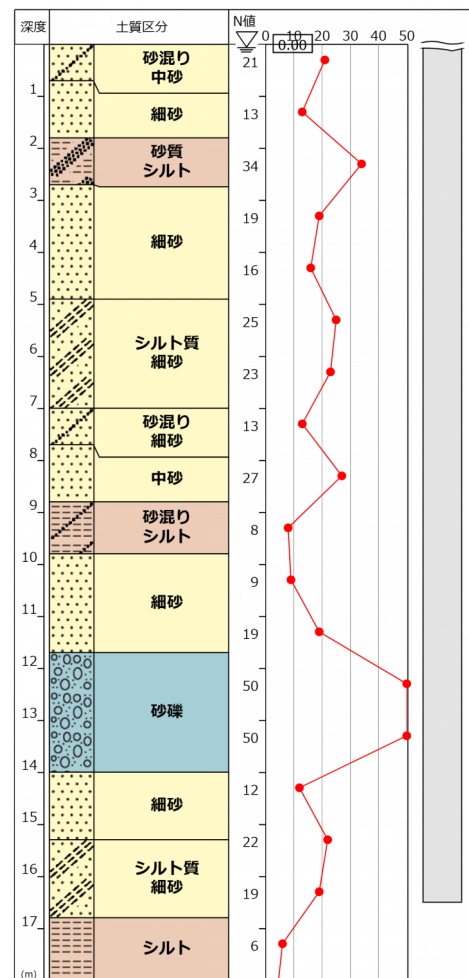

※50を超える場合は換算N値とする。
