



ジャイロプレス工法

○ 鋼管杭圧入工法



施工中




施工前



施工後

工 事 名	大手ふ頭 護岸補強実施設計
工 事 目 的	港湾工事
施 工 場 所	愛知県 名古屋市港区第三町
発 注 者	名古屋港管理組合
元 請 業 者	鈴中工業 株式会社
施 工 業 者	株式会社 梶川建設
施 工 期 間	2022年11月 ~ 2022年12月
施 工 機 械	ジャイロパイラーF401
型 式 ・ 寸 法	φ1200 L=22.0m 1本物 30本
特 長 ・ 効 果	・ 名古屋港に位置する大手ふ頭の護岸補強工事です。 ・ 港湾から鋼管を運ぶので、22.0m1本物での供給でした。 ・ 圧入した鋼管は、護岸の基礎としての役割を担っています。

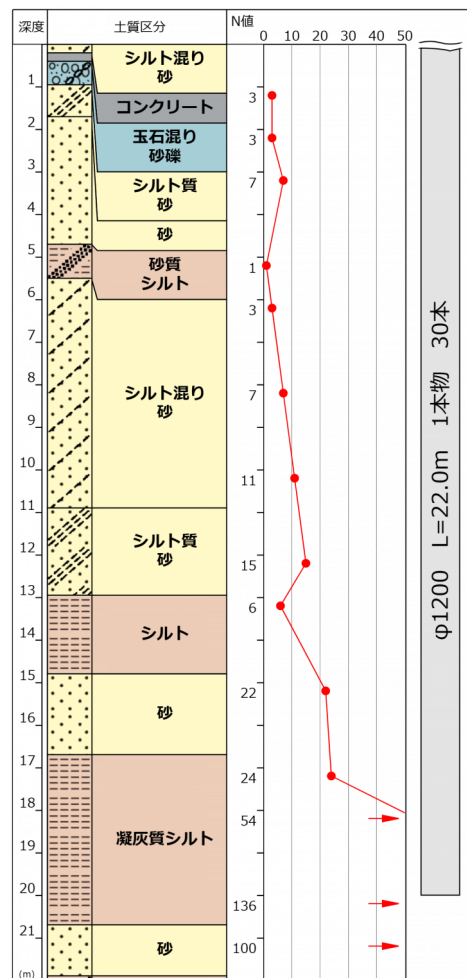

※50を超える場合は換算N値とする。



株式会社 梶川建設

〒447-0033 愛知県碧南市天神町2丁目8番地
TEL :0566-48-3690 FAX :0566-48-7126 URL :http://www.kajikawa.co.jp

Created by GIKEN "PAS-Maker"
