

硬質地盤クリア工法



施工中




施工中



施工後

工 事 名	清瀬水再生センター汚泥処理設備再構築に伴う建設その2工事
工 事 目 的	上下水道工事
施 工 場 所	東京都 清瀬市下宿三丁目1375番地
発 注 者	東京都下水道局
元 請 業 者	株式会社 フジタ
施 工 業 者	株式会社 梶川建設
施 工 期 間	20221月～20234月
施 工 機 械	サイレントパイラー SCU-ECO400S, サイレントパイラー ECO82, TK550
型 式 ・ 寸 法	鋼矢板 III型 L=3.5～8.0m n=836
特 長 ・ 効 果	- 硬質地盤クリア工法による土留鋼矢板圧入 - 施工箇所狭小地によりテレスコプクレーンを使用して施工 - 鋼矢板引抜時は周辺地盤への影響を考慮し、GEOTETS協会による引抜同時充填工法を採用。

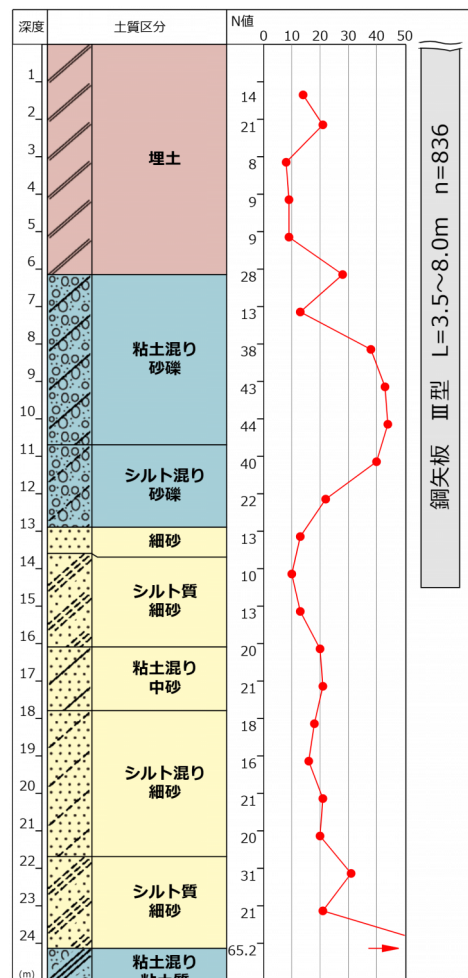

※50を超える場合は換算N値とする。
