



ジャイロプレス工法

○ 鋼管杭圧入工法



施工中①




施工中②



施工前

工 事 名	広域河川堀川改修工事（R6五条橋その3）
工 事 目 的	河川工事
施 工 場 所	愛知県 中区三の丸一丁目始め2か町
発 注 者	名古屋市緑政土木局河川部河川工務課
元 請 業 者	名工建設 株式会社
施 工 業 者	株式会社 梶川建設
施 工 期 間	2024年11月～2024年12月
施 工 機 械	ジャイロクリアパイラー GRAL1520(SP8)
型 式 ・ 寸 法	鋼管杭φ1500 t=25/15 L=24.5m （1か所継ぎ） 22本
特 長 ・ 効 果	堀川の老朽した護岸を新しくする工事としてジャイロプレス工法を採用。川岸に、液状化対策、土留め、高波対策の効果が想定できる。

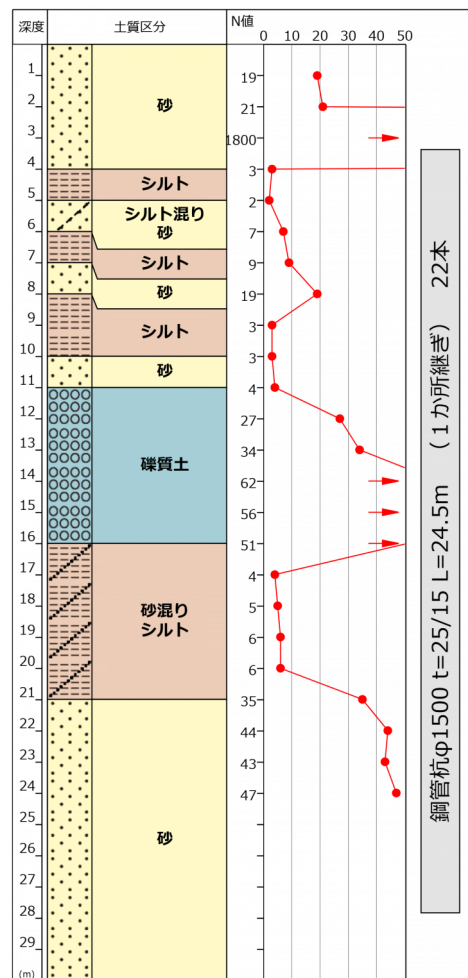

※50を超える場合は換算N値とする。



株式
会社

梶川建設

〒447-0036 愛知県碧南市尾城町2丁目51番地
TEL :0566-48-3690 FAX :0566-48-7126 URL :http://www.kajikawa.co.jp

Created by GIKEN "PAS-Maker"
