



ゼロ矢板圧入工法



施工後




施工前



施工中

工 事 名	街路築造工事及び擁壁設置工事（5二一補212用賀）
工 事 目 的	道路工事
施 工 場 所	東京都 世田谷区用賀二丁目地内から同区用賀四丁目地内まで
発 注 者	東京都 建設局 第二建設事務所
元 請 業 者	株式会社 ガイアート
施 工 業 者	株式会社 梶川建設
施 工 期 間	2024年4月 ~ 2025年4月
施 工 機 械	ゼロパイラー JZ100
型 式 ・ 寸 法	ゼロ矢板 L=10.5m×13枚 ゼロ矢板 L=12.0m×6枚 SP-Ⅳ型 L=12.0m×12枚
特 長 ・ 効 果	・ 擁壁改修のための土留め鋼矢板 ・ 既存建物の間の狭隘スペースをサイレントパイラーにより施工

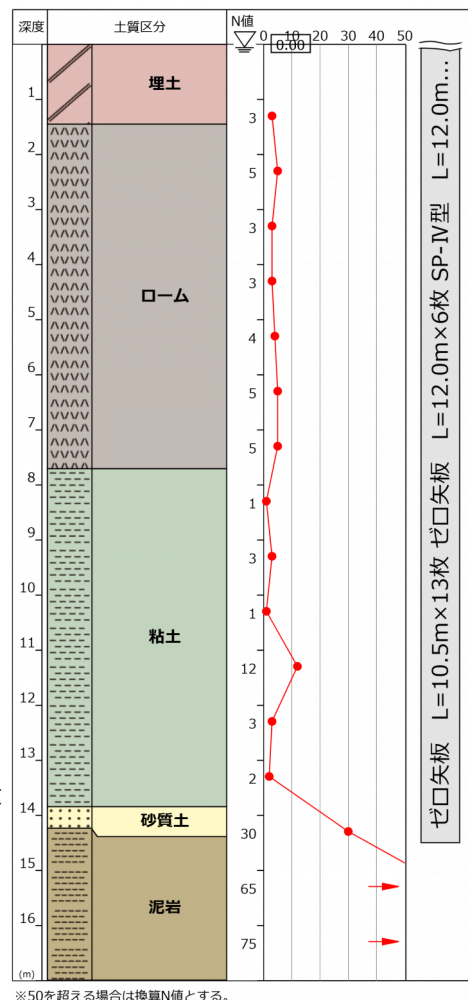

※50を超える場合は換算N値とする。



株式
会社

梶川建設

〒447-0036 愛知県碧南市尾城町2丁目51番地

TEL :0566-48-3690 FAX :0566-48-7126 URL :http://www.kajikawa.co.jp

Created by GIKEN "PAS-Maker"
