

# 硬質地盤クリア工法

広幅型鋼矢板圧入工法




施工中



施工中

工 事 名	一級河川堂島川（旧淀川）護岸補修工事（R7天神橋下流左岸）
工 事 目 的	河川工事
施 工 場 所	大阪府 大阪市北区中之島
発 注 者	大阪府西大阪治水事務所
元 請 業 者	株式会社 エムエヌテック
施 工 業 者	株式会社 梶川建設
施 工 期 間	R8年4月
施 工 機 械	スーパークラッシュ SCU-600M
型 式 ・ 寸 法	L=13.5m 68枚
特 長 ・ 効 果	表層部に既存の玉石層がありオーガー併用圧入となった。 又、陸上からでは作業半径等もんだいがある為、台船施工にてシンプルかつコンパクトな施工方法を採用。 第三書の生活に支障を与えず工事完了。

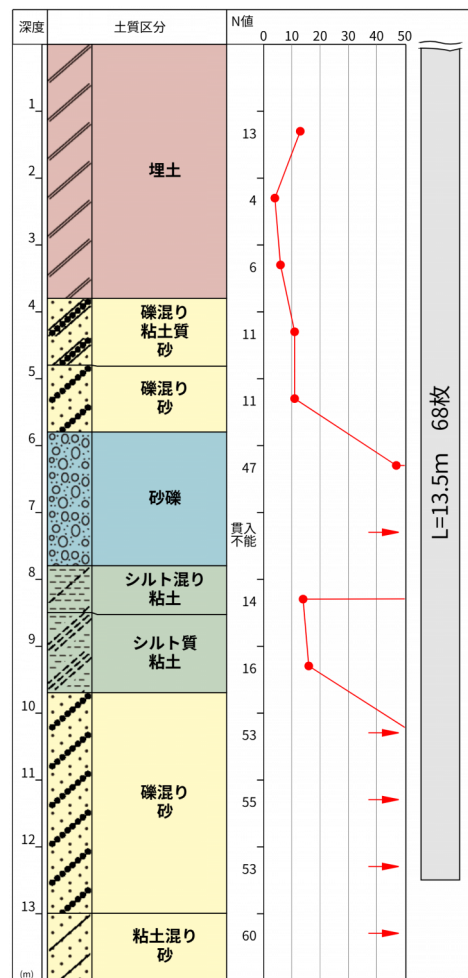

※50を超える場合は換算N値とする。
