



鋼管矢板圧入工法

ウォータージェット併用工法




施工中



施工中



施工前

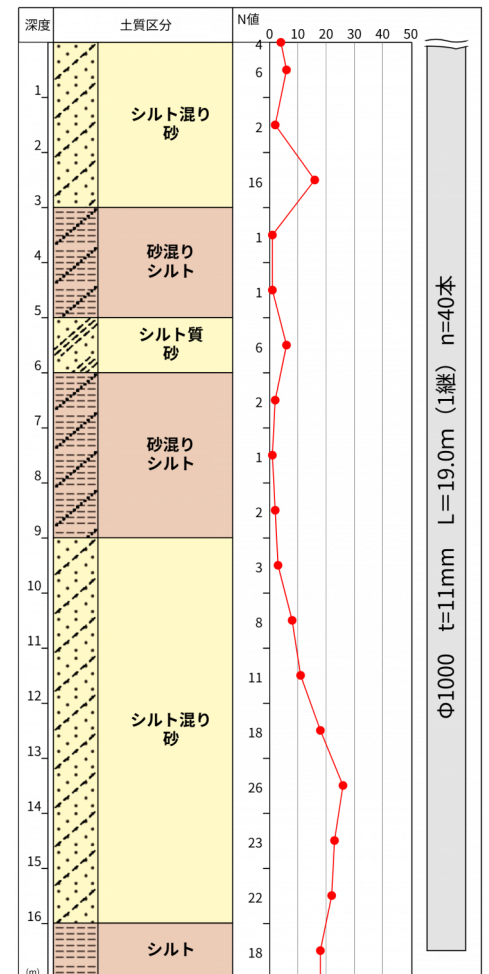

※50を超える場合は換算N値とする。

工 事 名	県単河川維持工事（浜田川護岸工）
工 事 目 的	河川工事
施 工 場 所	千葉県 千葉市美浜区
発 注 者	千葉県千葉土木事務所
元 請 業 者	市原建設工業株式会社
施 工 業 者	株式会社 梶川建設
施 工 期 間	R7年7月 ~ R7年12月
施 工 機 械	F401
型 式 ・ 寸 法	1000 t=11mm L = 19.0m (1継) n=40本
特 長 ・ 効 果	二級河川浜田川水系浜田川において、老朽化した河川護岸の復旧工事を行う。インプラントナビを使用し、出来形管理を実施した。
