




施工中



施工中

工 事 名	大手ふ頭護岸改良工事（その4）
工 事 目 的	港湾工事
施 工 場 所	愛知県 名古屋市港区
発 注 者	名古屋港管理組合
元 請 業 者	鈴中工業 株式会社
施 工 業 者	株式会社 梶川建設
施 工 期 間	R8年1月 ~ R8年2月
施 工 機 械	ジャイロパイラーF401, クラップクレーンCB4-2
型 式 ・ 寸 法	鋼管杭 1200 L=20.5m =18.0m(1箇所継) 34本
特 長 ・ 効 果	・ 老朽化した護岸を補強する為の鋼管杭施工です。 ・ 作業基地から施工ヤードが離れており、仮設レスで施工できるGRBシステムが採用されています。

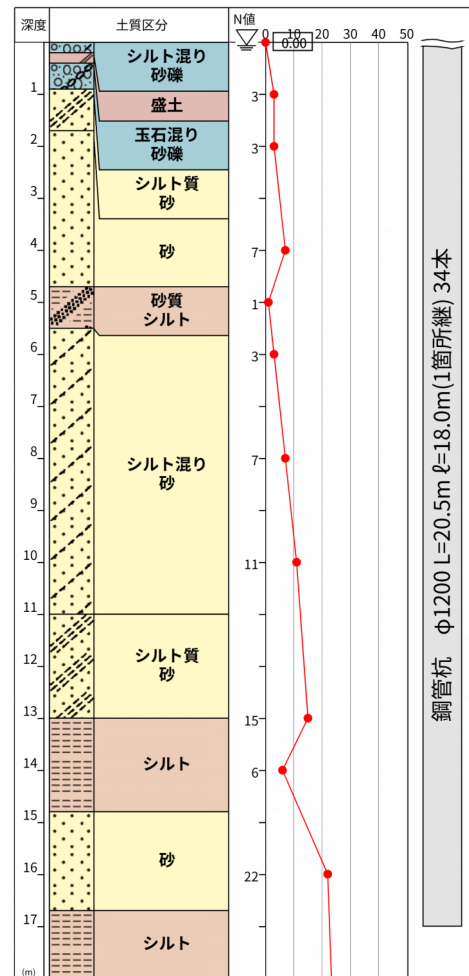

※50を超える場合は換算N値とする。
