



ゼロクリアランス工法



ゼロ矢板圧入工法



硬質地盤クリア工法




施工中



施工中

工 事 名	令和7年度公農災工第1号農道細木1号線(無名橋)災害復旧
工 事 目 的	道路工事
施 工 場 所	静岡県 静岡市葵区
発 注 者	静岡市
元 請 業 者	株式会社 アースシフト
施 工 業 者	株式会社 梶川建設
施 工 期 間	R7年10月
施 工 機 械	SCZ-ECO600S
型 式 ・ 寸 法	NS-SP-J 8.0m 17枚
特 長 ・ 効 果	隣接建築物に影響を軽減する為、土留壁として鋼矢板が採用されました。より近接している現場境界ギリギリまで土留壁を広げる為、ゼロ矢板が採用され、換算最大N値 = 187.5に硬質地盤クリア工法による、オーガ併用で鋼矢板を圧入しました。

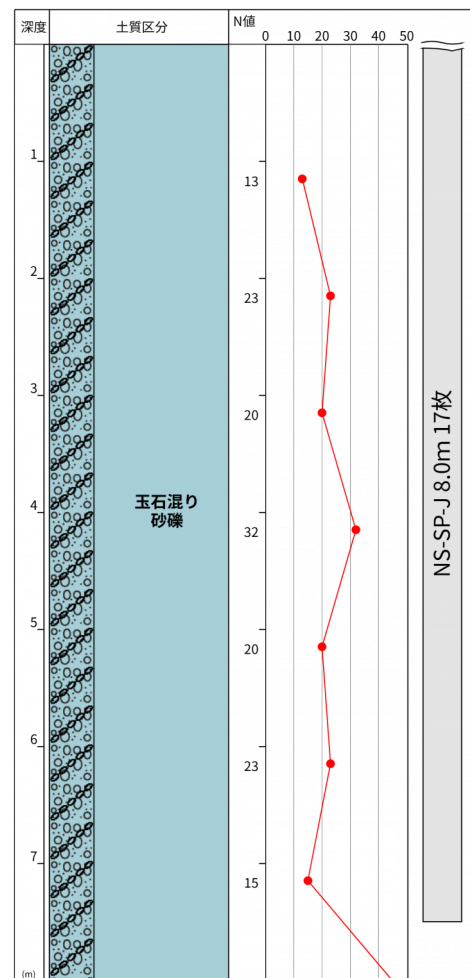

株式
会社

梶 川 建 設

〒447-0036 愛知県碧南市尾城町2丁目51番地

TEL :0566-48-3690 FAX :0566-48-7126 URL :http://www.kajikawa.co.jp

Created by GIKEN "PAS-Maker"
