



上部障害クリア工法



広幅型鋼矢板圧入工法



ウォータージェット併用工法



施工中




施工前



施工後

工 事 名	令和5年度 23号豊川橋橋梁補強工事
工 事 目 的	橋梁工事
施 工 場 所	愛知県 豊橋市
発 注 者	名古屋国道事務所
元 請 業 者	徳倉建設 株式会社
施 工 業 者	株式会社 梶川建設
施 工 期 間	R7年11月 ~ R8年4月
施 工 機 械	CLW100, CJ330
型 式 ・ 寸 法	w型 16.0m 104枚、 型 16.5m 244枚、 型 15.5m 122枚
特 長 ・ 効 果	・ 豊川橋を支える橋脚の補強工事にて仮締切工を施工 ・ 桁下での施工となるため上部障害クリア工法にて鋼矢板を圧入施工 ・ 鋼矢板建込みはクリアパイラーの吊り込み装置を使用して施工

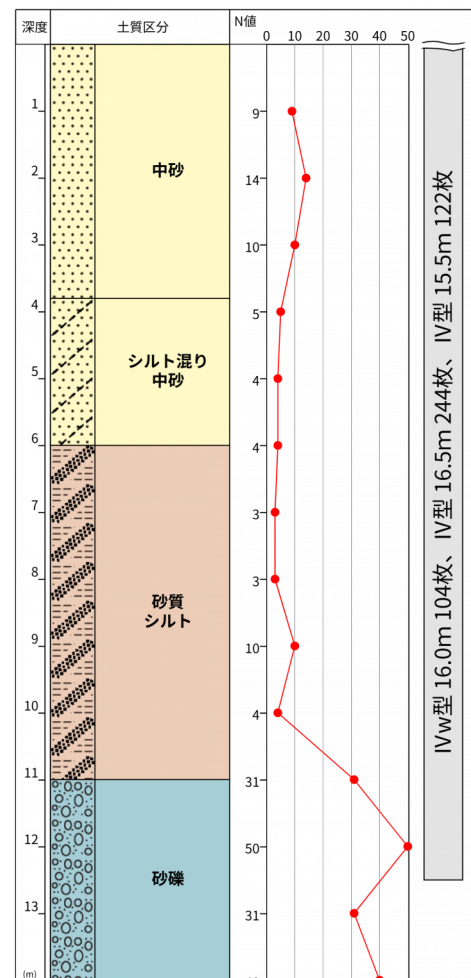

株式
会社

梶 川 建 設

〒447-0036 愛知県碧南市尾城町2丁目51番地

TEL :0566-48-3690 FAX :0566-48-7126 URL :http://www.kajikawa.co.jp

Created by GIKEN "PAS-Maker"
