



上部障害クリア工法


鋼管矢板圧入工法



橋梁下での施工



工 事 名	令和5年度新曙橋（P2橋脚）耐震補強工事
工 事 目 的	橋梁工事
施 工 場 所	東京都江東区
発 注 者	東京都港湾局
元 請 業 者	北野建設㈱
施 工 業 者	株式会社 角藤 土木事業部
施 工 期 間	2024年10月～2025年3月
施 工 機 械	鋼管クリアパイラー CLP200
型 式 ・ 寸 法	φ800 L=28.5m～29.5m
特 長 ・ 効 果	・機械寸法を徹底的に圧縮した超低空頭専用圧入機を使用することにより、超低空間での施工を実現。 ・圧入機本体に吊り込み装置を装備しているため、鋼管矢板吊込み用のクレーンを必要としない。

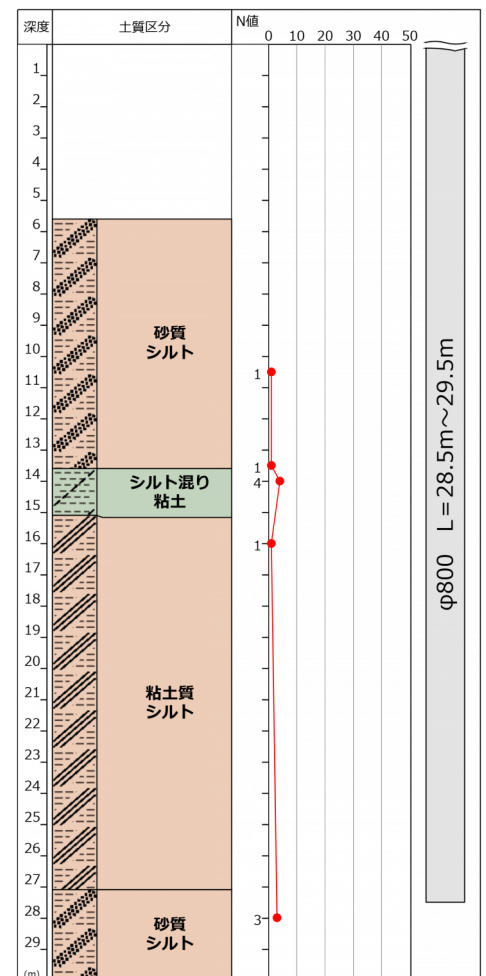

※50を超える場合は換算N値とする。
