




ジャイロプレス工法

○ 鋼管杭圧入工法

↑ GRBシステム



工 事 名	令和5年度主要地方道天童大江線道路施設復旧工事
工 事 目 的	災害復旧工事
施 工 場 所	山形県 西村山郡 大江町
発 注 者	山形県村山総合支庁建設部
元 請 業 者	国井建設株式会社
施 工 業 者	株式会社 佐藤重機建設
施 工 期 間	2024年4月 ~ 2024年7月
施 工 機 械	ジャイロクリアパイラー GRAL1520(SP8), クラumpクレーンCB4-2
型 式 ・ 寸 法	鋼管杭 φ1500 t=16mm L=20.5m
特 長 ・ 効 果	・ 令和5年2月に発生した道路法面崩落の災害復旧工事 ・ クラumpクレーンを使用して片側交差通行を確保

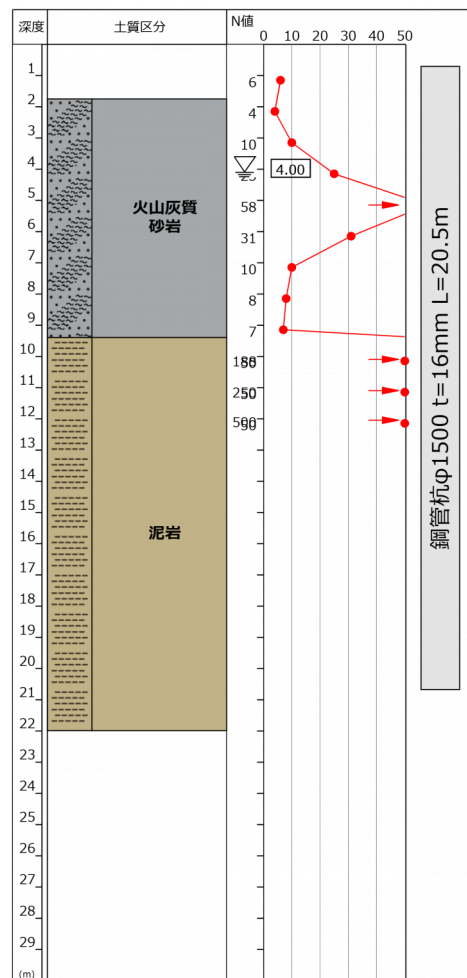

※50を超える場合は換算N値とする。
