




ハット形鋼矢板圧入工法

硬質地盤クリア工法

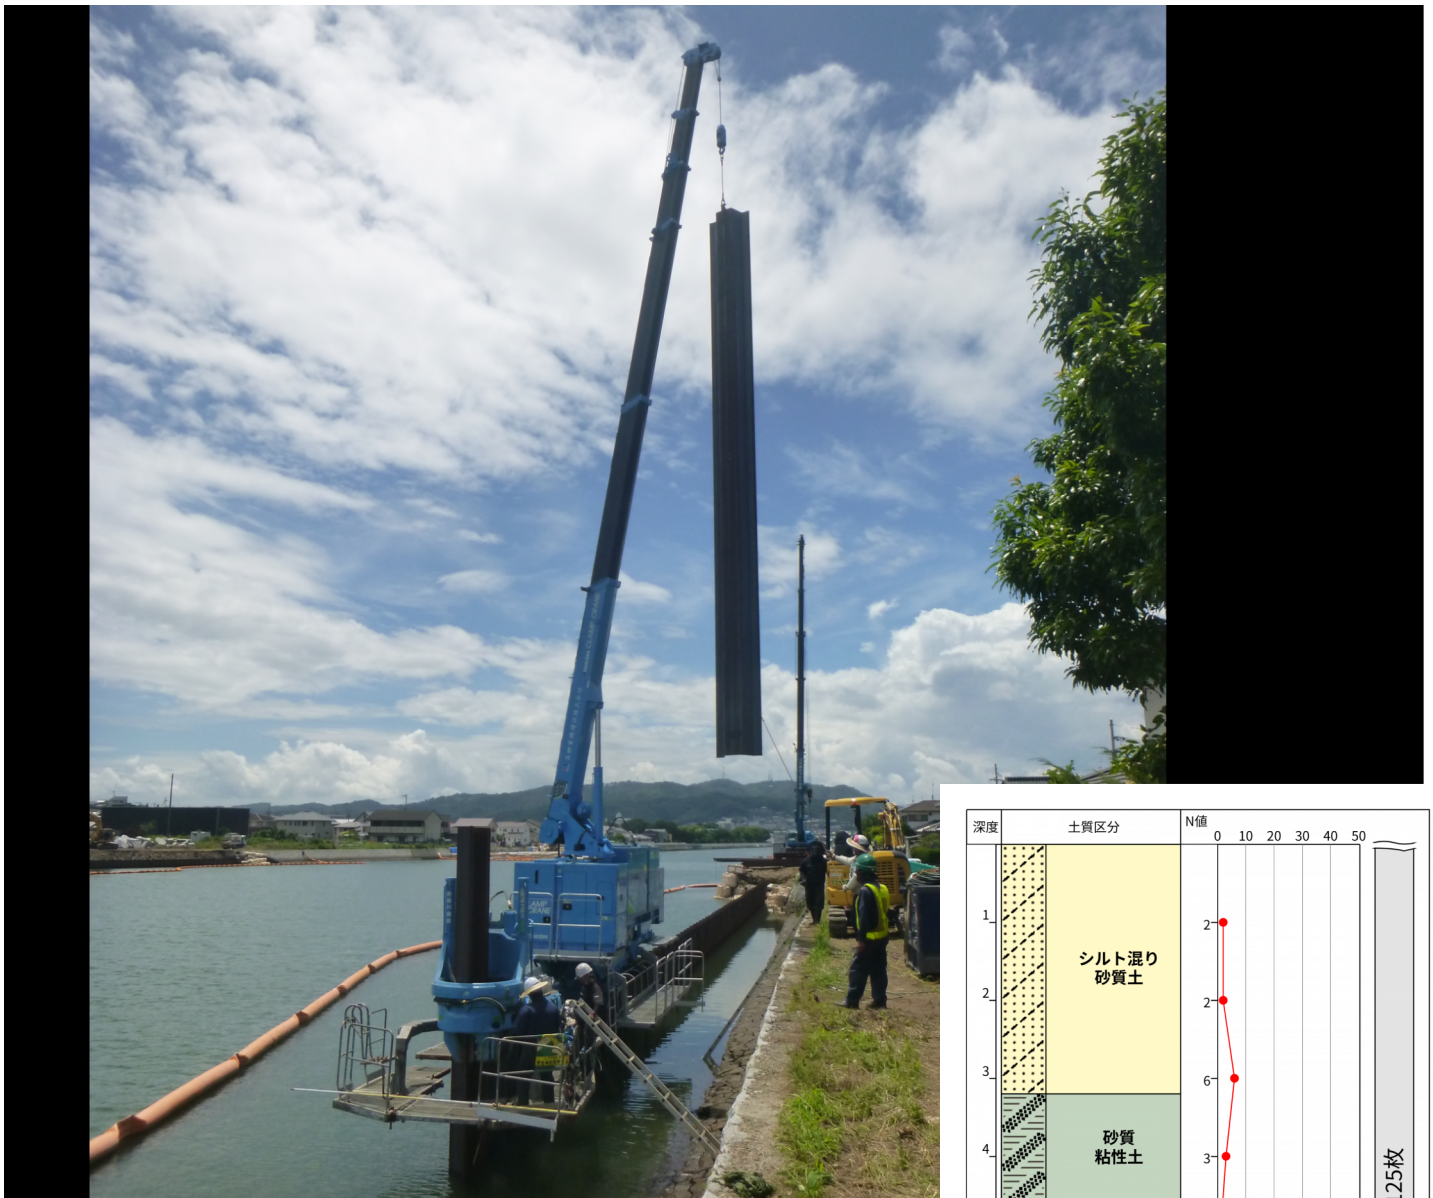

施工中

工 事 名	相引川津波等対策河川工事(1工区)
工 事 目 的	河川工事
施 工 場 所	香川県高松市
発 注 者	香川県高松土木事務所
元 請 業 者	えびす石材土木 株式会社
施 工 業 者	株式会社 梶川建設
施 工 期 間	R7年6月 ~ R7年7月
施 工 機 械	サイレントパイラー-F301, クランプクレーンCB2-9 , パイルランナーPR-1
型 式 ・ 寸 法	25H L=11.5m n=125枚
特 長 ・ 効 果	<ul style="list-style-type: none"> ・ 護岸改修（津波対策）工事に伴い、仮設レス ・ ノンステーキング工法にて施工 ・ 環境負荷を大幅に低減 ・ 後退自走装置にて120枚自走

