

# 硬質地盤クリア工法



J P N


U形鋼矢板圧入工法

GRBシステム

ノンステーキング工法



工 事 名	国道250号坂越道路護岸工 その4
工 事 目 的	護岸工事
施 工 場 所	兵庫県 赤穂市
発 注 者	西播磨県民局光都土木事務所
元 請 業 者	
施 工 業 者	株式会社竹内クレーン工業
施 工 期 間	2017年2月 ~ 2017年4月
施 工 機 械	サイレントパイラー SCU-ECO600S, クラumpクレーンCB2-9,PR1
型 式 ・ 寸 法	VL型 L=12m( 11.5m) 計180枚
特 長 ・ 効 果	国道250号線に隣する護岸工の為の仮設工。 ノンステーキング工法の採用により、作業ヤードが狭い場所でも大がかりな仮設構台が不要である。 完成杭の天端を作業軌道として進んでいく為、隣接した道路の交通を妨げることなく施工完了。

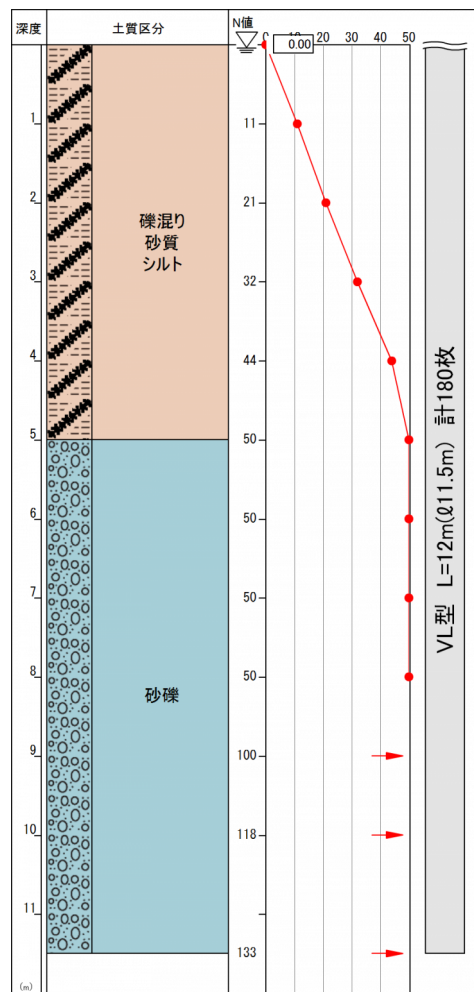

※50を超える場合は換算N値とする。
