




▼ 工事概要

工事名	北関東自動車道 西長岡跨線橋（下部工）工事		
施工場所	群馬県 太田市 西長岡		
発注者	日本道路公団 東京建設局 高崎工事事務所		
施工業者	石川・柏井経常建設共同企業体	圧入業者	株式会社 技研施工
区分	オーガ併用圧入	施工期間	H 14.5 ~ H 14.8
施工機械	スーパークラッシュ SCU-400M		
工事目的	跨線橋下部工の土留		
型式・寸法	鋼矢板 III型 L = 9.0 m		
特長・効果	砂礫層への圧入（玉石最大径φ300~500mm掘削時確認） 小スペース施工が可能（近接鉄道に配慮） 無振動、無騒音施工で周辺環境に配慮		

▼ 土質柱状図

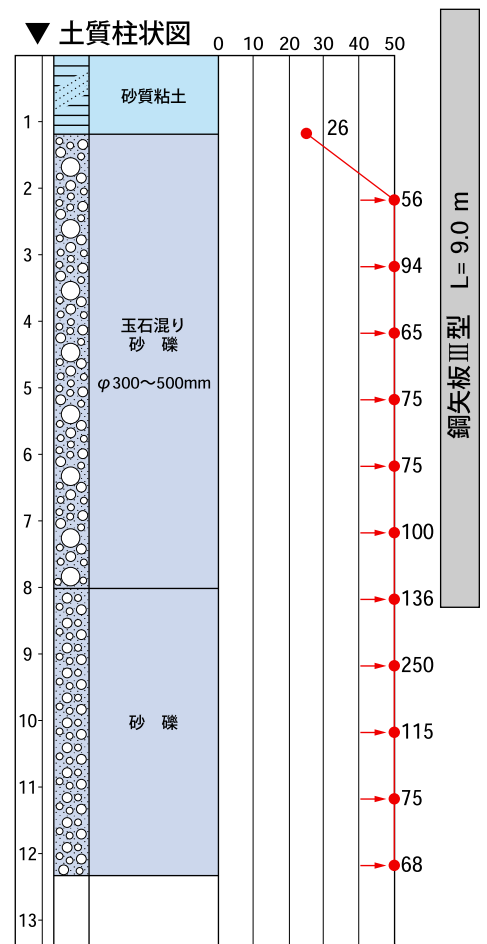

※ 50を超える場合は換算N値とする。
