




▲システム施工



▲施工前



▲施工後

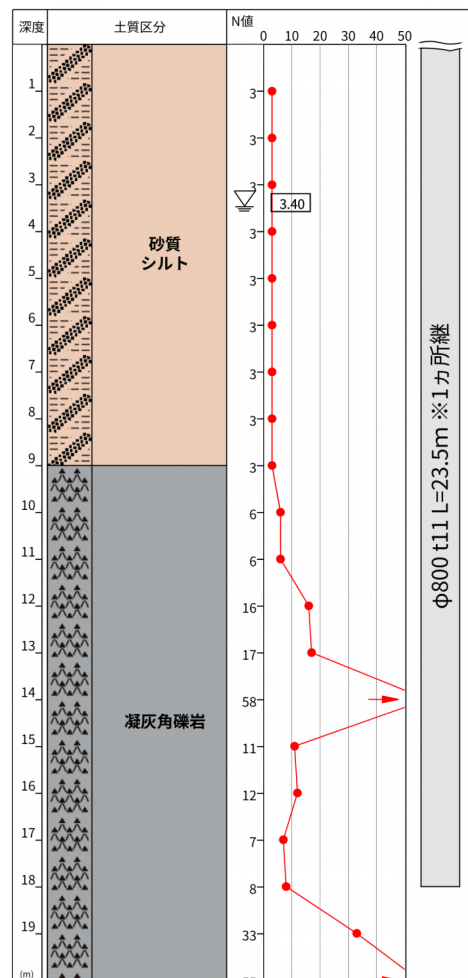

※50を超える場合は換算N値とする。

工 事 名	令和 6 年能登半島地震 能越自動車道道路啓開工事その 6
工 事 目 的	災害復旧工事
施 工 場 所	石川県 鳳珠郡穴水町宇留地 県道1号
発 注 者	国土交通省 北陸地方整備局
元 請 業 者	鹿島建設 株式会社
施 工 業 者	株式会社 技研施工
施 工 期 間	2024年7月 ~ 2024年8月
施 工 機 械	ジャイロパイラー F401, クラブルクレーンCB3-6
型 式 ・ 寸 法	φ 800 t11 L=23.5m 1カ所継
特 長 ・ 効 果	・ 地中に完全に押し込まれた杭(完成杭)を掴む機構のため、原理的に転倒しない機械。 ・ 工場生産された高品質な杭材を早期に投入して期間内での躯体構築を可能にした。 ・ 杭上で完結するシステム施工により施工ヤードを極小化。啓開済み道路の交通を妨げることなく施工。 ・ 昼夜 2 交替作業による急速施工により早期復旧を実現。能登大橋付近の対面通行を可能にした。
