




・施工時




・震災直後

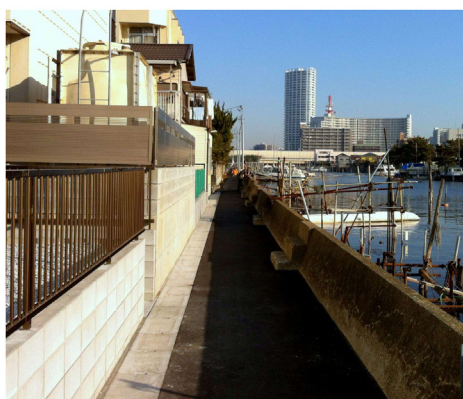

・完成写真

工 事 名	市道10-016号線ほか1路線道路災害復旧工事(その2)
工 事 目 的	震災により地盤沈下が発生した道路の復旧工事
施 工 場 所	千葉県 船橋市栄町1丁目2730番551ほか1
発 注 者	船橋市
元 請 業 者	株式会社 三幸土木
施 工 業 者	株式会社 石井基礎工事
施 工 期 間	H23.8月 ~ H23.9月
施 工 機 械	ゼロパイラー JZ100A, クラumpクレーンCB1A, パイルランナーPR-1
型 式 ・ 寸 法	ゼロ矢板SM-J L=5.0m n=171枚
特 長 ・ 効 果	・無振動、無騒音施工により隣接する民家への影響が最小限。 ・GRBシステムを使用することで重機が侵入できない狭い現場においても最小限度の作業スペースで、作業可能。 ・既存構造物や近接構造物へのゼロ近接施工が可能。

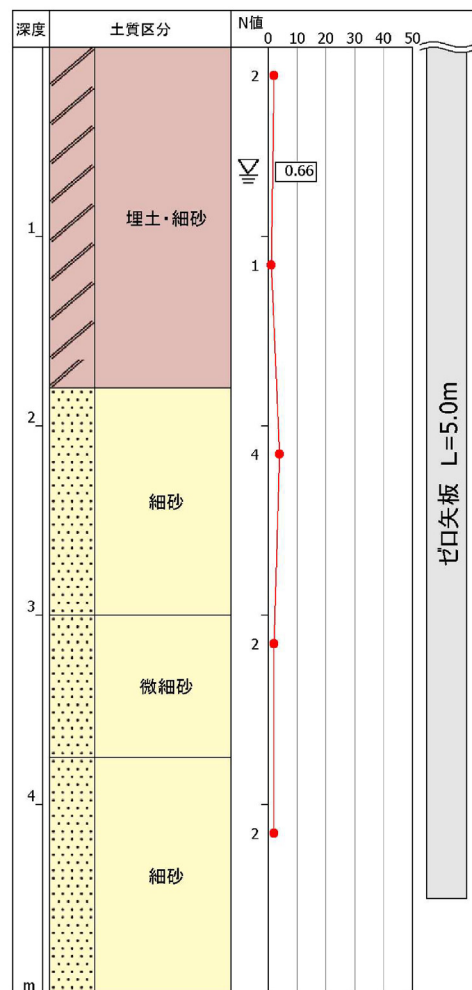

※50を超える場合は換算N値とする。
