




| | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工 事 名 | (仮称)寺田病院計画 |
| 工 事 目 的 | 建築工事 |
| 施 工 場 所 | 東京都 足立区扇一丁目 |
| 発 注 者 | 医療法人社団 俊和会 |
| 元 請 業 者 | 三井住友建設 株式会社 |
| 施 工 業 者 | 株式会社 梶川建設 |
| 施 工 期 間 | H24.5月 |
| 施 工 機 械 | サイレントパイラー SCZ-ECO600S |
| 型 式 ・ 寸 法 | SM-Jパイール L=8.5m~13.0m |
| 特 長 ・ 効 果 | 7階建病院新築工事における、土留支保工仮設工事において建築基礎有効面積を最大限利用する為、ゼロクリアランス工法にて施工。歩道近接部の施工であったが歩行者に影響を与えず施工を行えた。 |

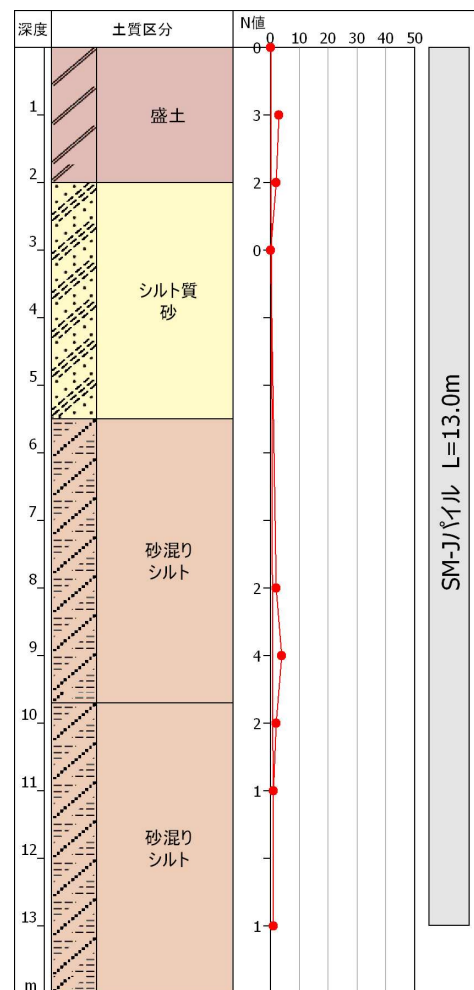

※50を超える場合は換算N値とする。
