


鋼管杭圧入工法



工 事 名	令和元年度京浜運河（大井JCT）防潮堤建設工事
工 事 目 的	河川工事
施 工 場 所	東京都 品川区八潮1-4
発 注 者	東京都財務局
元 請 業 者	名工建設 株式会社
施 工 業 者	株式会社 梶川建設
施 工 期 間	2020年7月
施 工 機 械	ジャイロクリアパイラー GRAL1520(SP8)
型 式 ・ 寸 法	1400, t 19, L=24.5m, n=21本
特 長 ・ 効 果	・ 既設護岸の耐震補強工事 ・ 既設鋼管杭へ設置し、既設鋼管矢板へ締切り施工を行った ・ 河川での足場等がない条件化でも、圧入機や発砲台船を使用し施工が可能

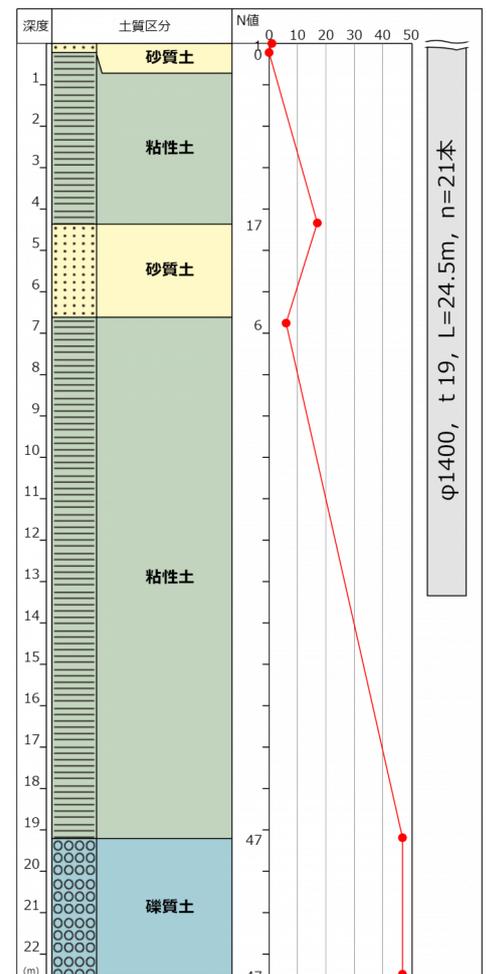

※50を超える場合は換算N値とする。
