



鋼管矢板圧入工法




ウォータージェット併用工法



施工中




施工前

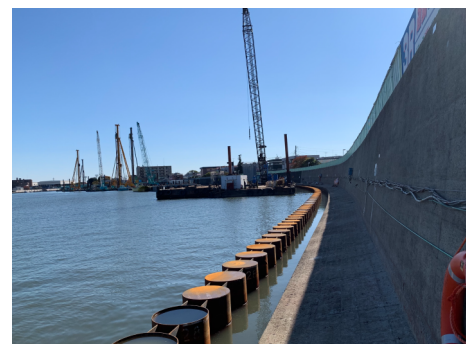

施工後

工 事 名	中川護岸耐震補強工事（その204）
工 事 目 的	河川工事
施 工 場 所	東京都 葛飾区青戸一丁目地内から同区青戸二丁目地内まで
発 注 者	東京都 江東治水事務所
元 請 業 者	若築・海洋建設共同企業体
施 工 業 者	株式会社 梶川建設
施 工 期 間	2020年9月～2020年11月
施 工 機 械	サイレントパイラーF401, ウォータージェット併用
型 式 ・ 寸 法	φ800, t=9mm, L=28.5m, n=231本
特 長 ・ 効 果	- 土質として設計深度中間部のN値が40程度あったため、ウォータージェット4連にて施工を行った - 既設護岸の耐震補強工事

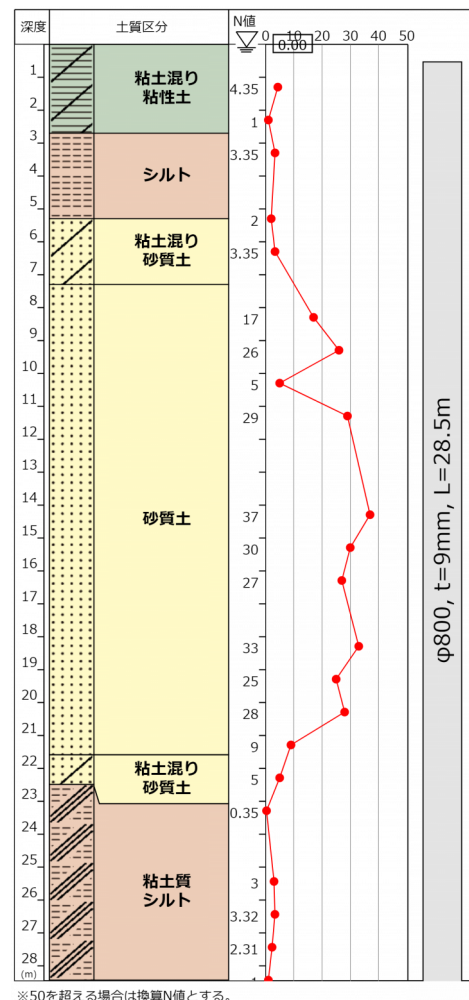

株式会社 梶川建設

〒447-0033 愛知県碧南市天神町2丁目8番地
TEL :0566-48-3690 FAX :0566-48-7126 URL :http://www.kajikawa.co.jp

Created by GIKEN "PAS-Maker"
