



上部障害クリア工法

NETIS登録番号：CB-060016-V




U形鋼矢板圧入工法



ウォータージェット併用工法



工 事 名	H22. (国)150号社会資本整備総合交付金工事(弁財天川橋)
工 事 目 的	橋梁補強工事
施 工 場 所	静岡県 掛川市 西大淵 地内
発 注 者	静岡県 袋井土木事務所
元 請 業 者	株式会社 樽林組
施 工 業 者	株式会社 小澤土木
施 工 期 間	H22.11月～H22.12月
施 工 機 械	クリアパイラー CL70
型 式・寸 法	Ⅲ型 L=8.5m (2～5箇所継) 107枚
特 長・効 果	既設橋梁の橋脚を耐震補強するための鋼矢板仮締切り工でした。クリアパイラーの設置・回収やその他の機材を荷卸しするためのクレーンが、鋼矢板法線に近づくことができるよう、仮設棧橋を構築し、施工した事例です。 鋼矢板計画天端から既設橋の桁下までのクリアランスは1.90mであり、鋼矢板Ⅲ型、L=8.5mを2箇所～5箇所継ぎにて圧入施工しました。

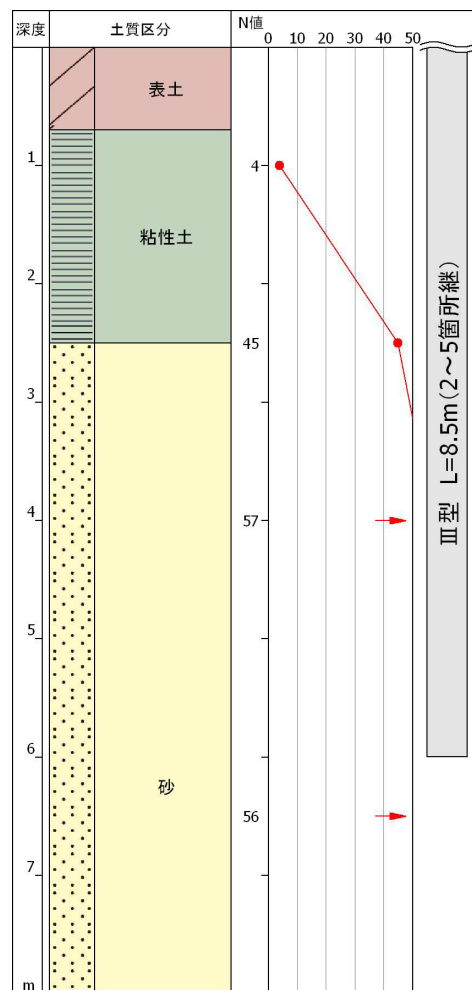

※50を超える場合は換算N値とする。
