




圧入施工状況



施工前



施工後

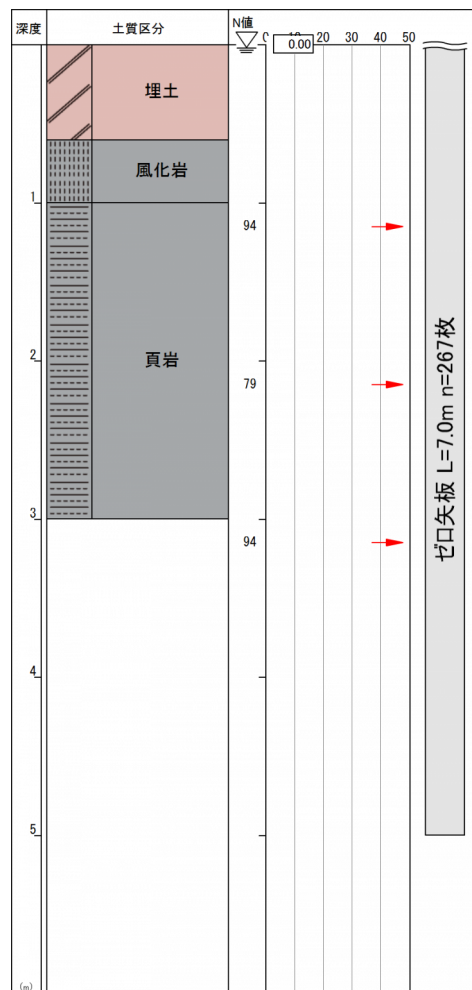

※50を超える場合は換算N値とする。

工 事 名	準用(住市総)浜男川河川改修(護岸その11)工事
工 事 目 的	河川改修
施 工 場 所	福岡県 福岡市東区香椎駅前2丁目
発 注 者	福岡市道路水道局
元 請 業 者	(株)竹内土建
施 工 業 者	(株)親和
施 工 期 間	2014年12月 ~ 2015年1月
施 工 機 械	ゼロクリア SCZ-ECO600S, クラップ クレーン, エットランナー, パイルランナー
型 式 ・ 寸 法	ゼロ矢板 L=7.0m n=267枚
特 長 ・ 効 果	- 最大N値94の頁岩層へのパイルオーガ併用圧入 - 掘削範囲が河川側のみのため、既設護岸・家屋への近接施工が可能 - U形鋼矢板と比較し、大きな河川断面を確保 - システム施工により狭隘地での圧入施工を実現
