




鋼管矢板圧入工法

NETIS登録番号：CB-980119-V



硬質地盤クリア工法

NETIS登録番号：CB-980118-V

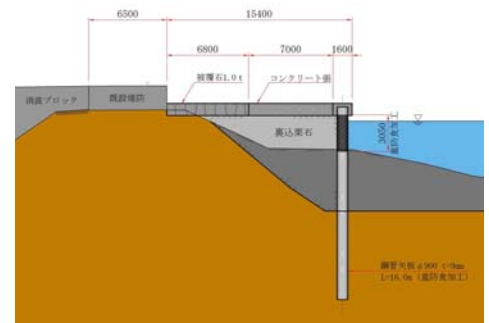


▲標準断面図



▲捨石(φ800mm程度)

工 事 名	飯岡漁港地域漁港整備東防波堤(新設)工事
工 事 目 的	防波堤の新設
施 工 場 所	千葉県 旭市 下永井
発 注 者	千葉県 農林水産部 銚子漁港事務所
元 請 業 者	若築建設 株式会社
施 工 業 者	株式会社 梶川建設
施 工 期 間	H23.12月 ~ H24.1月
施 工 機 械	スーパークラッシュ鋼管パイラー SCP260
型 式 ・ 寸 法	鋼管矢板φ900 t=9 L-T継手 L=16.0m(1本もの) n=21本
特 長 ・ 効 果	・φ800mm程度の捨石層(層厚5.0m)への圧入施工。 (捨石を事前撤去すると堤防が崩壊する恐れがあったため) ・仮設構台や台船が不要で漁船の航路を阻害しない。 ・パイルオーガの削孔範囲を最小限に留め、海水汚濁を抑える。

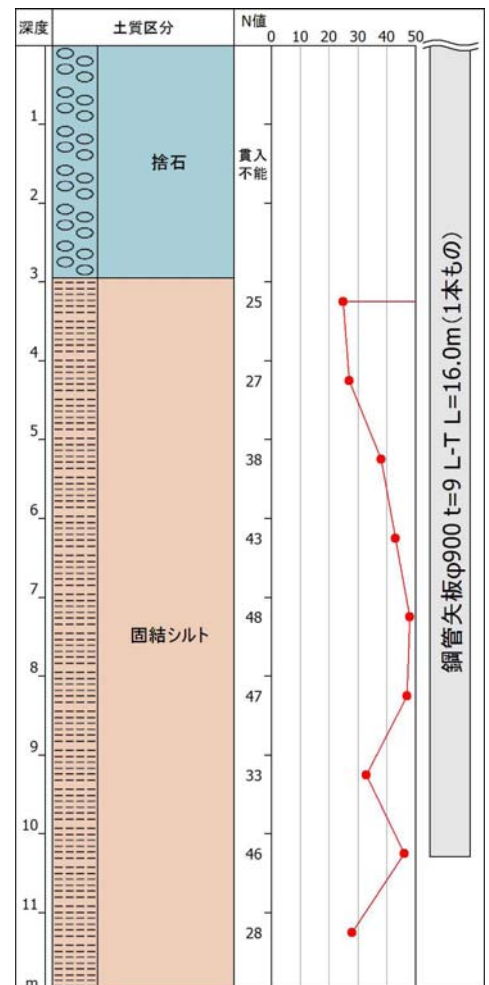

※50を超える場合は換算N値とする。



株式会社 梶川建設

〒447-0033 愛知県碧南市天神町2丁目8番地

TEL : 0566-48-3690 FAX : 0566-48-7126 URL : <http://www.kajikawa.co.jp>

Created by GIKEN "PAS-Maker"
