




工 事 名	一級河川尻無川耐震護岸工事（岩崎橋下流右岸その2）
工 事 目 的	河川工事
施 工 場 所	大阪府 大阪市西区千代崎3丁目
発 注 者	大阪府都市整備部
元 請 業 者	アジア建設工業 株式会社
施 工 業 者	株式会社 梶川建設
施 工 期 間	H25 6月
施 工 機 械	鋼管パイラー PP300C
型 式 ・ 寸 法	鋼管矢板 φ1200mm L=22.5m
特 長 ・ 効 果	鉄道に近接する河川の護岸耐震工事、大型の機械設備の設置は難しく、クレーンブームも鉄道への倒壊防止処置としてブーム長さを設定、また鋼管矢板を2本繋ぎ（1箇所溶接）で材料を搬入し、鉄道への影響を最小限考慮し鋼管パイラーで施工を行った。

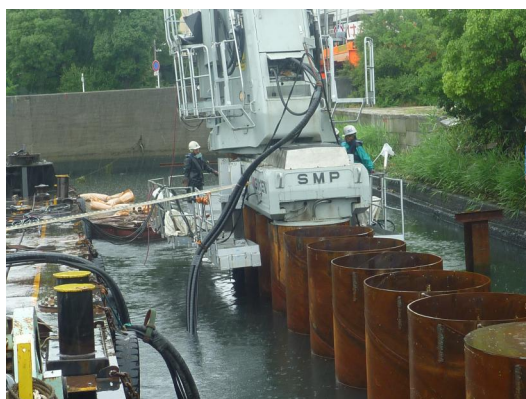
