




工 事 名	二級河川関口川筋関口川水門仮締切工事
工 事 目 的	河川工事
施 工 場 所	岩手県 下閉伊郡山田町関口
発 注 者	岩手県
元 請 業 者	株式会社山下組
施 工 業 者	株式会社 梶川建設
施 工 期 間	H28年3月 ~ H28年4月
施 工 機 械	クリアパイラー CLF120
型 式 ・ 寸 法	鋼矢板 L型 L=15.5m 10個所継
特 長 ・ 効 果	・吊込み装置を装備した圧入機を採用し、鋼矢板吊込み用のクレーンを必要としない施工を実現した。 ・超低空頭専用圧入機を使用することにより、圧入機上部の構造物を撤去・復旧することなく、超低空間での施工を可能にした。 ・砂礫、玉石を含む地層のため、WJ併用圧入に変更することで大幅に施工性を向上させた。

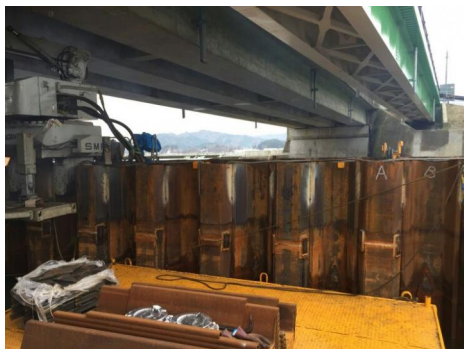
