



広幅型鋼矢板圧入工法

ウォータージェット併用工法




施工中



施工中

工 事 名	令和4年度 海岸高潮対策工事(防災安全)(3号工)(R3国補正)
工 事 目 的	河川工事
施 工 場 所	愛知県 豊橋市杉山町
発 注 者	愛知県建設局 東三河建設事務所
元 請 業 者	朝日土木興業 株式会社
施 工 業 者	株式会社 梶川建設
施 工 期 間	2023年5月 ~ 2023年6月
施 工 機 械	SW100, CJ330
型 式 ・ 寸 法	VIL L=20.5m 1継
特 長 ・ 効 果	・ 田原湾内三河湾大橋すぐ下での広幅鋼矢板圧入 ・ 高潮による堤防への影響を抑制するための工事

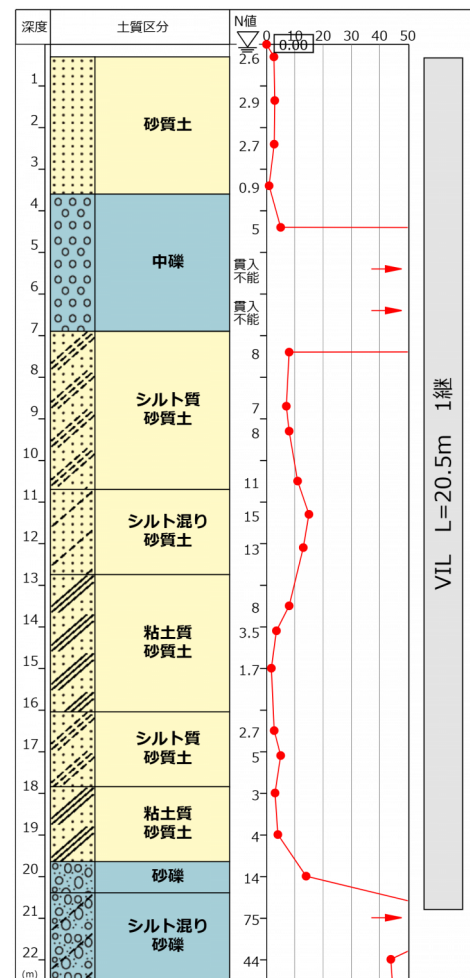

株式会社 梶川建設

〒447-0033 愛知県碧南市天神町2丁目8番地
TEL :0566-48-3690 FAX :0566-48-7126 URL :http://www.kajikawa.co.jp

Created by GIKEN "PAS-Maker"
