

ゼロ矢板圧入工法




施工中



施工前



施工後

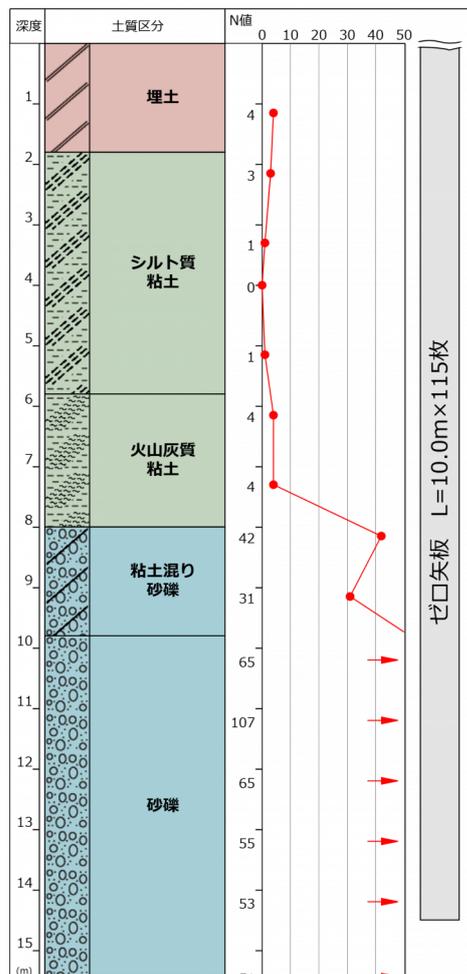

※50を超える場合は換算N値とする。

工事名	都市計画道路瀬谷地内線（二ツ橋中部地区）街路整備工事（その1）
工事目的	排水路工事
施工場所	神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷1丁目12番地先から二ツ橋町407番地先まで
発注者	横浜市 脱炭素EXPO推進局上瀬谷整備推進課
元請業者	株式会社 坂田組
施工業者	株式会社 梶川建設
施工期間	R7年4月～R7年5月
施工機械	ゼロパイラー SCZ-ECO600S
型式・寸法	ゼロ矢板 L=10.0m×11.5枚
特長・効果	<ul style="list-style-type: none"> 水路新設のため、民地擁壁と既設擁壁の間をゼロクラッシュで施工した 民家へ配慮しながら施工した
