


硬質地盤クリア工法



▼ 工事概要

工 事 名	町道・上石井・道路新設工事（橋梁橋脚(P3)工事）		
施工場所	福島県 東白川郡 塙町大字上石井・台宿 地内		
発 注 者	塙町役場		
施工業者	深谷建設 株式会社	圧入業者	勿来建機 株式会社
区 分	オーガ併用圧入	施工期間	H19.10月
施工機械	サイレントパイラー ECO-400S		
工事目的	橋脚新設の為に土留め工		
型式・寸法	鋼矢板Ⅲ型 L=7.5m n=92枚		
特長・効果	硬質片岩層(N値250)へ鋼矢板を圧入施工。 生分解性油脂(パイラーエコオイル・グリース)を使用。この為、万が一、油漏れが発生した場合でも自然界のバクテリアによって短期間に分解・消失する油脂を標準採用。		

▼土質柱状図

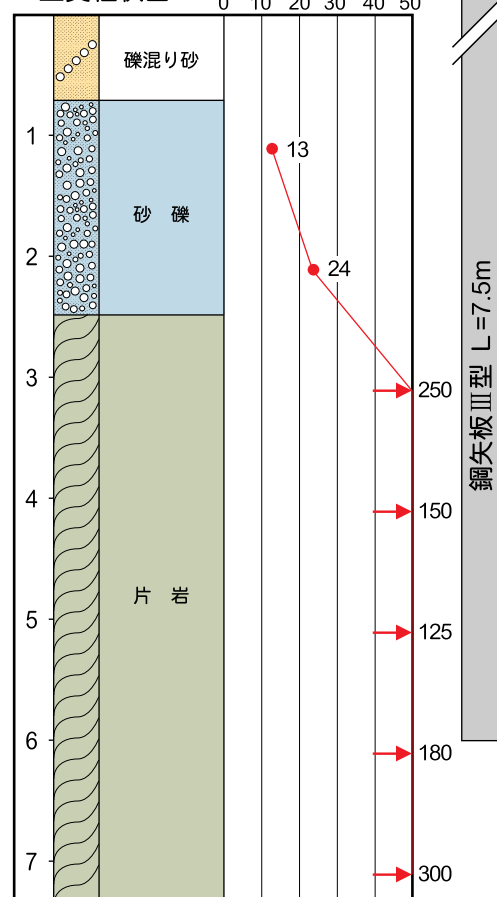

※ 50を超える場合は換算N値とする。
