




▼工程地质

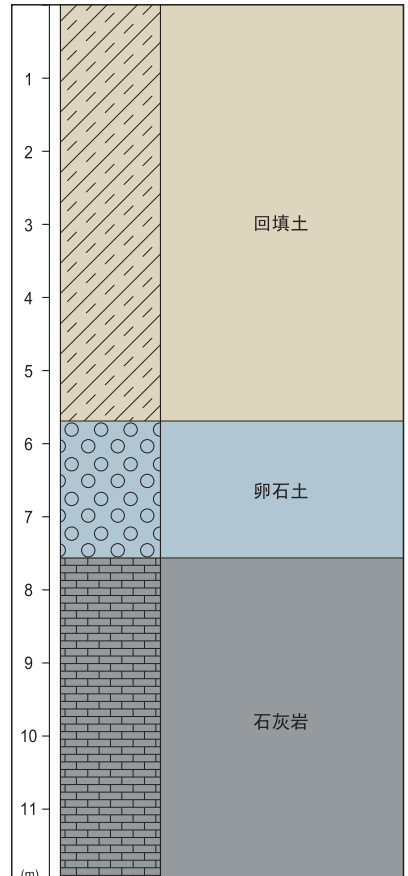

超过50时, 视为换算N值

▼工程概要

工程名称	沪昆客专长昆湖南段-资江特大桥工程		
施工单位	南通顺达路桥工程有限公司		
工程地点	湖南省邵阳市新邵县坪上镇筱溪村		
总包单位	中交第一公路工程局有限公司		
工程内容	建造桥墩用钢板桩临时围堰		
施工内容	钢板桩IVw型 L=12m 156根×1基(桥墩No.19) L=15m 154根×1基(桥墩No.20) 合计310根		
施工机型	SCU-600M	日平均施工数量	4 根/日 (螺旋钻并用压入)
最大 N 值	不明(砂卵石层最大 $\phi 800$, 石灰岩层单轴抗压强度最大 $\geq 50\text{MPa}$)		
特 征	实现了在N值超过50的卵石层、岩盘等坚硬地质的压入施工 机器轻量, 小型, 所以没有倾倒的危险 钻掘的范围控制在最小限度, 控制排土量, 所以不会破坏周边地基		
