





施工中

工 事 名	令和7年度 狼煙漁港（狼煙地区）災害復旧工事
工 事 目 的	港湾工事
施 工 場 所	石川県 珠洲市狼煙町
発 注 者	石川県
元 請 業 者	五洋建設 株式会社
施 工 業 者	株式会社 梶川建設
施 工 期 間	2026年5月 ~ 2026年6月
施 工 機 械	スーパークラッシュ ゼロパイラー SCZ-600
型 式 ・ 寸 法	ゼロ矢板 L=8.5m
特 長 ・ 効 果	・ 既存構造物や近接構造物へのゼロ近接施工が可能。 ・ 両フランジにウェブと平行な平坦部を設けた形状(ハット形)を採用しており、継手効率は100%となる材料を使用。 ・ 圧入杭材、地盤条件を考慮したパイルオーガを併用することにより、硬質地盤での低振動、低騒音施工を実現。

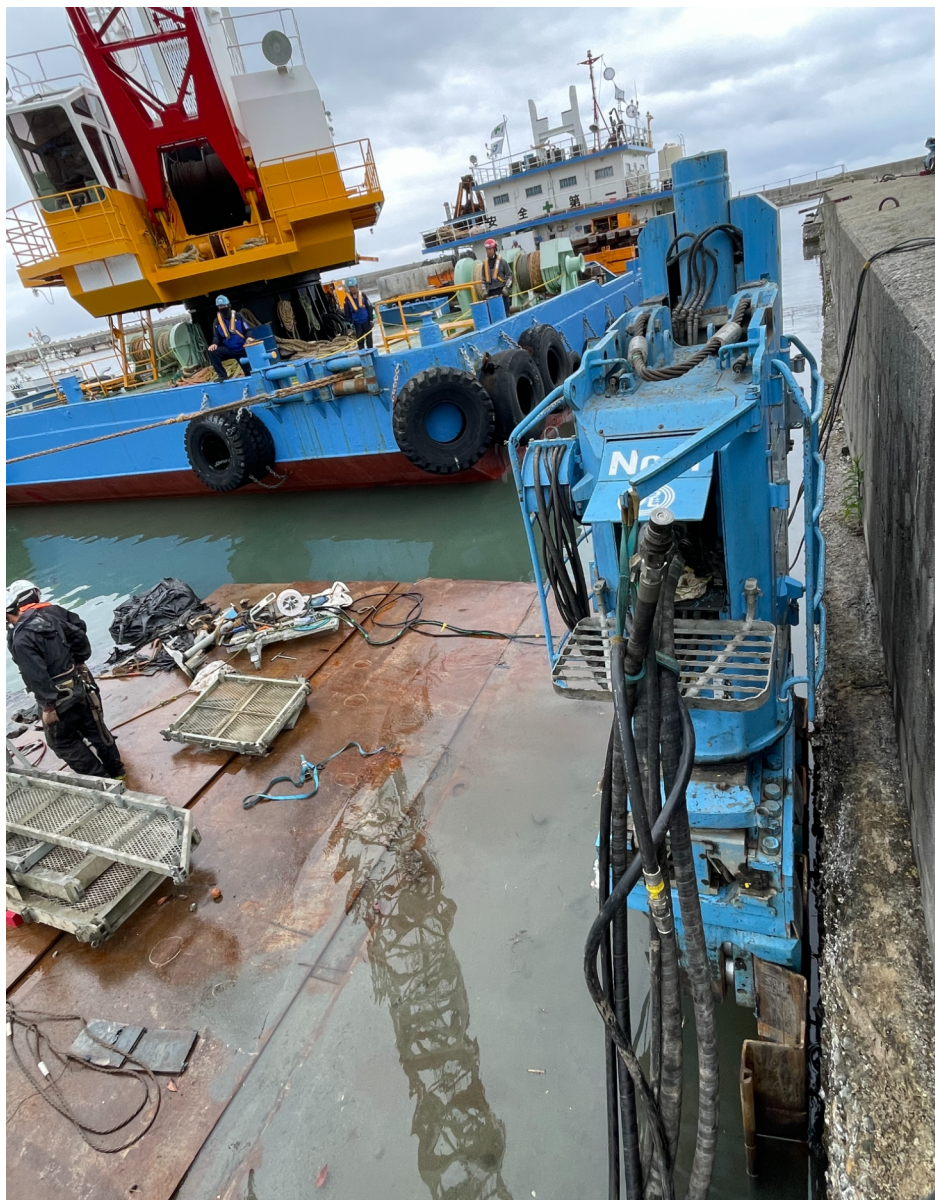

施工前

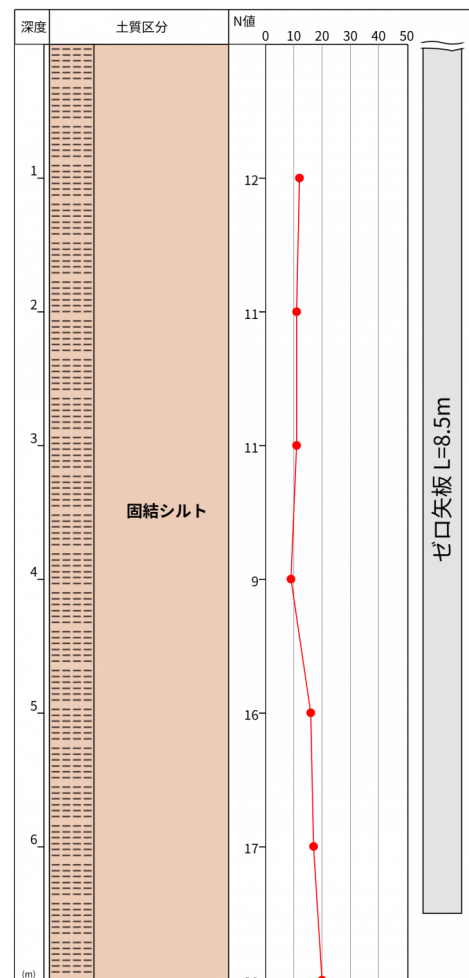

※50を超える場合は換算N値とする。
