ゼロクリアランス工法

ゼロ矢板圧入工法　硬質地盤クリア工法

1.施工中

2.施工完了

3.施工中（初期反力工）

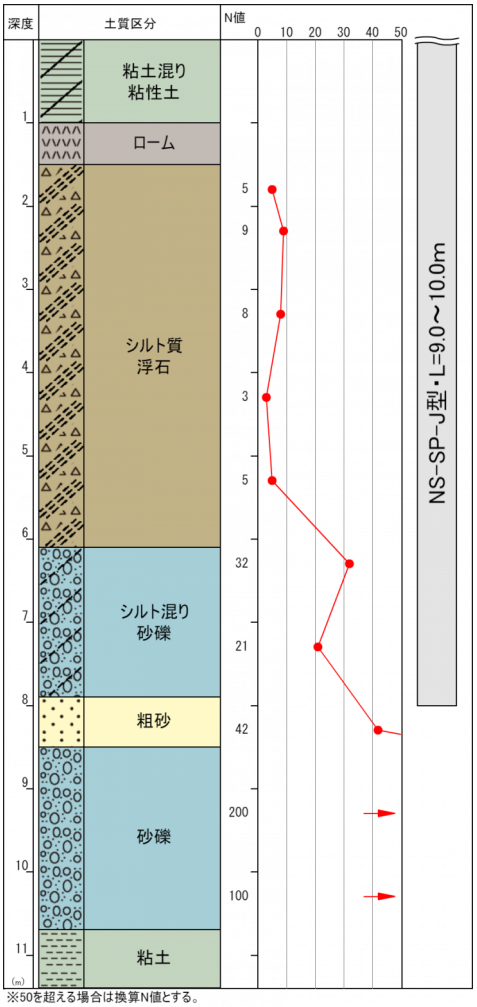

※50を超える場合は換算N値とする。

工　事　名	都営住宅29ＣM-101西(世田谷区下馬2丁目・世田谷区施設)工事その2
工 事 目 的	建築工事
施 工 場 所	東京都 世田谷区下馬2-31-33
発　注　者	公共機関
元 請 業 者	奈良建設　株式会社
施 工 業 者	株式会社 梶川建設
施 工 期 間	H30年11月
施 工 機 械	ゼロパイラー SCZ-ECO600S
型 式 ・ 寸 法	NS-SP-J型・L=9.0m～10.0m
特 長 ・ 効 果	・擁壁とL型側溝の間（400㎜以下）にゼロ矢板を圧入。（L型側溝解体同時並行） ・狭い隙間への圧入の為、近接施工可能なゼロクリアランス工法を採用。 ・初期反力圧入～数枚圧入後、約2mの高天端施工。 ・法線近くに架空線が多く存在したが、損傷させることなく無事施工完了。

株式会社 梶川建設

〒447-0033 愛知県碧南市天神町2丁目8番地
TEL :0566-48-3690 FAX :0566-48-7126 URL :http://www.kajikawa.co.jp

Created by GIKEN "PAS-Maker"
