鋼管矢板圧入工法

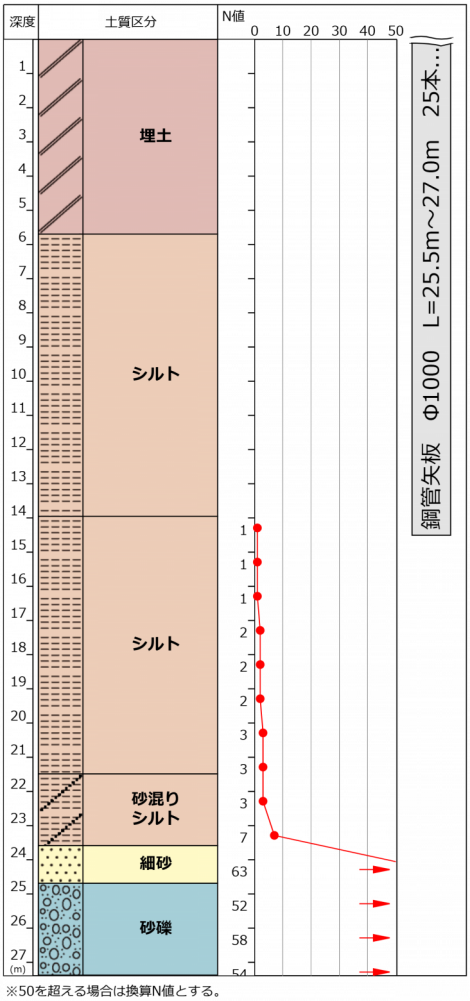

※50を超える場合は換算N値とする。

工事名	石神井川整備工事（新柳橋上下流左岸）
工事目的	河川工事
施工場所	東京都 北区豊島二丁目地内から同区堀船二丁目地内まで
発注者	東京都財務局
元請業者	大藤興業 株式会社
施工業者	株式会社 梶川建設
施工期間	2024年9月 ～ 2025年1月
施工機械	サイレントパイラーF401
型式・寸法	鋼管矢板　Φ1000　L=25.5m～27.0m　25本(ラクニカン)
特長・効果	・鋼管矢板圧入工法による河川護岸工。 ・管の径が途中変わる設計だったため、チャックとサドルを換装し施工した。 ・転石等の支障物が出ることもある中、撤去対応しながら無事施工した。

株式会社 梶川建設
〒447-0036 愛知県碧南市尾城町2丁目51番地
TEL :0566-48-3690 FAX :0566-48-7126 URL :http://www.kajikawa.co.jp

Created by GIKEN "PAS-Maker"
