鋼管矢板圧入工法

NETIS登録番号：CB-980119-V

ウォータージェット併用工法　ノンステージング工法

NETIS登録番号：KT-000106-V

工事名	H22.まちづくり交付金事業 舘山寺36号線　志ぶき橋架設工事
工事目的	護岸工事
施工場所	静岡県 浜松市　西区　舘山寺町
発注者	浜松市役所
元請業者	須山建設　株式会社
施工業者	株式会社　小澤土木
施工期間	H23.3月 ～ H23.3月
施工機械	鋼管パイラー PP260B, クランプクレーンCB3-2
型式・寸法	φ700mm t=9mm L=14.0m P-P継手 31本
特長・効果	映画『男はつらいよ』のロケ地にもなった舘山寺温泉街の志ぶき橋のたもとが浸食され、危険な状態となったため、護岸とともに改築するための工事でした。狭隘な作業ヤードの中で、鋼管パイラー（PP260）とクランプクレーン（CB3-2）によって鋼管矢板を圧入しています。

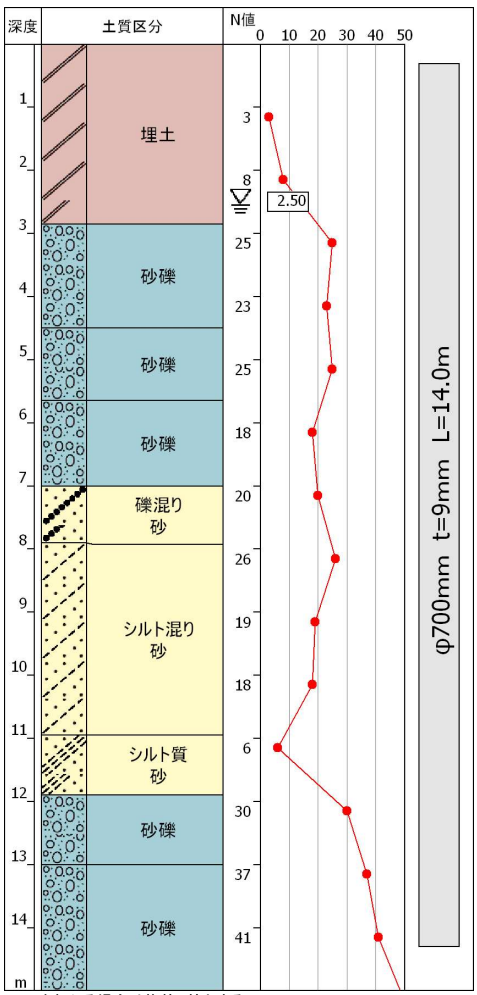

※50を超える場合は換算N値とする。

株式会社 小澤土木
静岡県　浜松市　中区　森田町　6番地
TEL :053-453-2891 FAX :053-453-2999 URL :http://www.ozawa-doboku.co.jp

Created by GIKEN "PAS-Maker"
